Stabilisation des berges du Parc de la Plage Jacques-Cartier

Suivi environnemental post travaux – Phases 1 et 2

Suivi de la végétalisation des ouvrages de stabilisation et du plan de remise en état des lieux

F2100845
PSP150140
Ville de Québec
Juin 2026

Final_R01



Créer des solutions pour une vie positive


ARTELIA

F2100845_R00

Juin 2026

Stabilisation des berges du Parc de la Plage Jacques-Cartier

Rapport de suivi environnemental post travaux - Phase 1 et 2

Végétalisation des ouvrages et remise en état des lieux - Année 1

PSP150140

Présenté à :

M. Jean-Thomas Beaulieu
Ville de Québec
Service des approvisionnements
50, rue Marie-de-l'Incarnation
Québec (Québec) G1N 3E7

Préparé par : Ilana Cantin, architecte paysagiste
Aménagement durable, Architecture du paysage et Urbanisme

Préparé et révisé par : Donald Girard, architecte paysagiste
Chef de service - Aménagement durable, Architecture du paysage et Urbanisme

Équipe de réalisation

Donald Girard	Architecte paysagiste
Ilana Cantin	Architecte paysagiste
Maria Ines De Lorenzo	Dessinatrice
Émeline Pillon	Adjointe administrative

Registre des émissions et révisions		
Identification	**Date**	**Description de l'émission et / ou révision**
_final	2026-03	Version finale
_final_r01	2026-06	Version finale révisée

Table des matières

1 Introduction 1
1.1 Contexte et description du projet 1
1.2 Conformité réglementaire et exigences des autorités 2
1.3 Objectifs du suivi de la végétalisation des ouvrages et du plan de remise en état des lieux 2
2 Description des travaux à l'étude 3
2.1 Travaux réalisés à la Phase 1 3
2.2 Travaux réalisés à la Phase 2 6
3 Suivi de la végétalisation des ouvrages et du plan de remise en état des lieux 10
3.1 État de référence 10
3.2 Méthodologie 10
4 Résultat - Suivi des ouvrages de végétalisation 15
4.1 Résultats de la Phase 1 - Végétalisation des ouvrages 15
4.2 Résultats de la Phase 2 - Végétalisation des ouvrages 16
4.3 Résultat de la remise en état des lieux 17
4.4 Portrait général par tronçon – Phase 1 18
4.5 Portrait général par tronçon – Phase 2 23
4.6 Portrait général - Remise en état des lieux (Phases 1 et 2) 29
5 Conclusion et recommandations 31
5.1 Interprétation des résultats 31
5.2 Comparaison avec les objectifs écologiques du projet 31
5.3 Influence des conditions hydrologiques et climatiques 32
5.4 Performance des techniques de stabilisation employées 33
5.5 Facteurs de réussite et contraintes observées 33
5.6 Mesures correctives 33
6 Bibliographie 36

Tableaux

Tableau 1 Échéancier de la réalisation des suivis en simultané pour les 2 phases 1
Tableau 2 Objectifs ciblés par le présent suivi environnemental 2

Figures

Figure 1 Localisation du site à l'étude 1
Figure 2 Localisation des tronçons de la Phase 1 3
Figure 3 Localisation des tronçons de la Phase 2 6
Figure 4 Localisation des transects de la phase 1 18
Figure 5 Localisation des transects de la phase 2 23

Annexes

Annexe A : Entretien des végétaux – extrait des clauses techniques particulières du devis pour construction

Annexe B : Fiches individuelles des végétaux

Annexe C : Tableaux synthèses des mesures par espèces

1 Introduction

1.1 Contexte et description du projet

Afin d'atténuer les problèmes d'érosion constatés sur les berges du Parc de la Plage Jacques-Cartier en bordure du fleuve Saint-Laurent, la Ville de Québec a réalisé des travaux de restauration des berges sur une longueur d'environ 1 215 m, entre l'extrémité du chemin de la plage Jacques-Cartier et la limite Est du parc, dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. La réalisation du projet s'est déroulée en deux phases : la première a été complétée en 2023 et la seconde en 2024.



Figure 1 Localisation du site à l'étude

Dans le cadre du projet de stabilisation des berges, la Ville de Québec doit effectuer un programme de suivi quinquennal des ouvrages de stabilisation mis en place afin de répondre aux exigences du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec (MELCCFP). Ce programme vise à vérifier l'intégrité des structures et à confirmer l'efficacité des concepts de protection employés pour chacun des tronçons du parc. À cet effet, un programme de suivi environnemental a été déposé dans le cadre des demandes d'autorisations ministérielles des Phases 1 et 2 du projet de stabilisation. Le programme de suivi environnemental comprend deux volets : l'entretien et le suivi. Alors que l'entretien a été intégré aux clauses techniques particulières du devis pour construction (voir **Annexe A**), le présent document traite du suivi des volets végétalisation des ouvrages et de la remise en état et présente les objectifs, la méthodologie, les résultats de chaque composante étudiée et les recommandations qui en découlent, le cas échéant. Le calendrier de réalisation de suivi pour chacune des composantes est présenté au Tableau 1 et comprend le suivi des espèces végétales exotiques envahissantes, des ouvrages de stabilisations, de la végétalisation des ouvrages, de la topométrie de la plage et du plan de remise en état des lieux.

Tableau 1 Échéancier de la réalisation des suivis en simultané pour les 2 phases

Activité	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Suivi des EVEE	Fin travaux Phase 1	Fin travaux Phase 2	x	x			
Suivi des ouvrages de stabilisation			x	x	x	x	x
Suivi de la végétalisation des ouvrages			x	x	x	x	x
Suivi de la topométrie de la plage			x		x		x
Suivi du plan de remise en état			x		x		x

Le présent document constitue l'année 1 du suivi de deux (2) des cinq (2) composantes évaluées, soit la **végétalisation des ouvrages** et le **plan de remise en état des lieux**. Les quatre années subséquentes prévues de 2026 à 2029 viendront compléter le portrait global de la végétalisation des ouvrages, tandis que deux autres périodes, prévues en 2027 et 2029, permettront de couvrir l'ensemble du suivi de la remise en état. Le bilan de l'étude et les conclusions pertinentes seront présentés dans le rapport final, qui sera déposé en 2029.

1.2 Conformité réglementaire et exigences des autorités

Un Programme de suivi environnemental a été soumis dans le cadre des demandes d'autorisations ministérielles des Phases 1 et 2 du projet de stabilisation (décret environnemental numéro 34-2022 du 12 janvier 2022). Ce programme regroupe l'ensemble des suivis auxquels l'initiateur s'est engagé et détaille les objectifs, la méthodologie et les modalités d'évaluation de la performance des ouvrages ciblés.

1.3 Objectifs du suivi de la végétalisation des ouvrages et du plan de remise en état des lieux

Les travaux répondent à un double objectif : prévenir l'érosion tout en préservant le caractère naturel du site et reconstituer le couvert végétal dans les secteurs dénudés ou perturbés par les interventions.

Le Programme de suivi environnemental précise les objectifs opérationnels ci-dessous :

Tableau 2 Objectifs ciblés par le présent suivi environnemental

Composante	Objectifs
Suivi de la végétalisation des ouvrages	• Assurer la survie des végétaux plantés lors de la réalisation des travaux. • Vérifier la progression de leur dispersion dans les ouvrages de stabilisation et en haut de talus.
Suivi du plan de remise en état des lieux	• Évaluer la qualité de la reprise végétale. • Émettre des recommandations sur l'entretien des végétaux et sur les correctifs nécessaires à faire, le cas échéant.

2 Description des travaux à l'étude

Le projet de stabilisation des berges a été réalisé en deux phases distinctes, soit la Phase 1 et Phase 2. Les sections suivantes présentent les interventions effectuées pour chacune d'elles, en distinguant les volets **Végétalisation des ouvrages** et **Remise en état des lieux**.

2.1 Travaux réalisés à la Phase 1

La première phase visait la reconstruction et la réhabilitation des ouvrages de stabilisation existants au moyen d'enrochements végétalisés sur une distance d'environ 550 m, couvrant les tronçons 1, 2 et 3. La végétalisation de ces enrochements repose principalement sur l'installation de lits de plançons. Contrairement aux tronçons 1 et 3, entièrement constitués de nouveaux enrochements, le tronçon 2 a conservé son enrochement existant. Dans ce tronçon, la végétalisation a été assurée par l'ajout de plants insérés dans des poches de plantation aménagées dans les interstices entre les roches déjà en place (interstices plantés). Par ailleurs, dans certains secteurs, des bandes végétalisées ont été aménagées au sommet des enrochements.

La conception des aménagements considère également le facteur humain et paysager, puisque la mise en place des végétaux a été réalisée selon une mise en scène paysagère soignée, visant à créer des ouvertures visuelles vers le paysage fluvial. Les espèces sélectionnées ont été positionnées dans l'enrochement selon trois patrons d'assemblage (A, B et C) qui se distinguent par la localisation des végétaux (haut, milieu ou bas de talus) ainsi que par la composition et les proportions propres à chaque type de plantation selon les besoins de conservation des vues sur le fleuve Saint-Laurent.

Ces trois tronçons se distinguent par des interventions présentant des configurations propres à chacun. Les principales particularités associées à chaque tronçon sont décrites aux pages suivantes. La figure ci-dessous fait la présentation des tronçons 1 à 3 de la Phase 1.


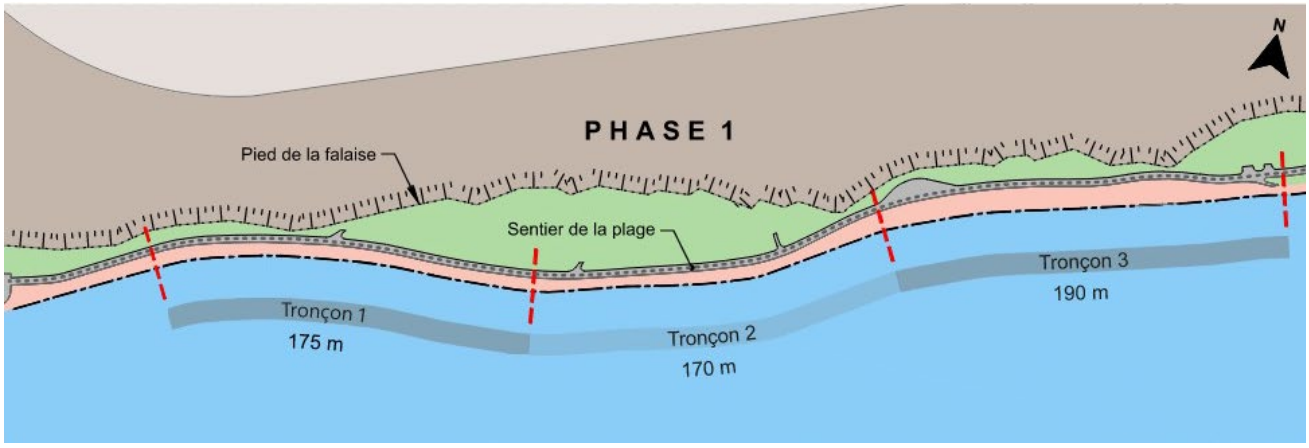


Figure 2 Localisation des tronçons de la Phase 1

2.1.1 Végétalisation des ouvrages


Tronçon 1

Au tronçon 1, la stabilisation des berges est réalisée au moyen d'un nouvel enrochement intégrant des lits de plants et de plançons. Une bande végétalisée, renforcée par des membranes de coco et des treillis métalliques (selon l'emplacement) est aménagée entre les enrochements végétalisés et le chemin de la plage.

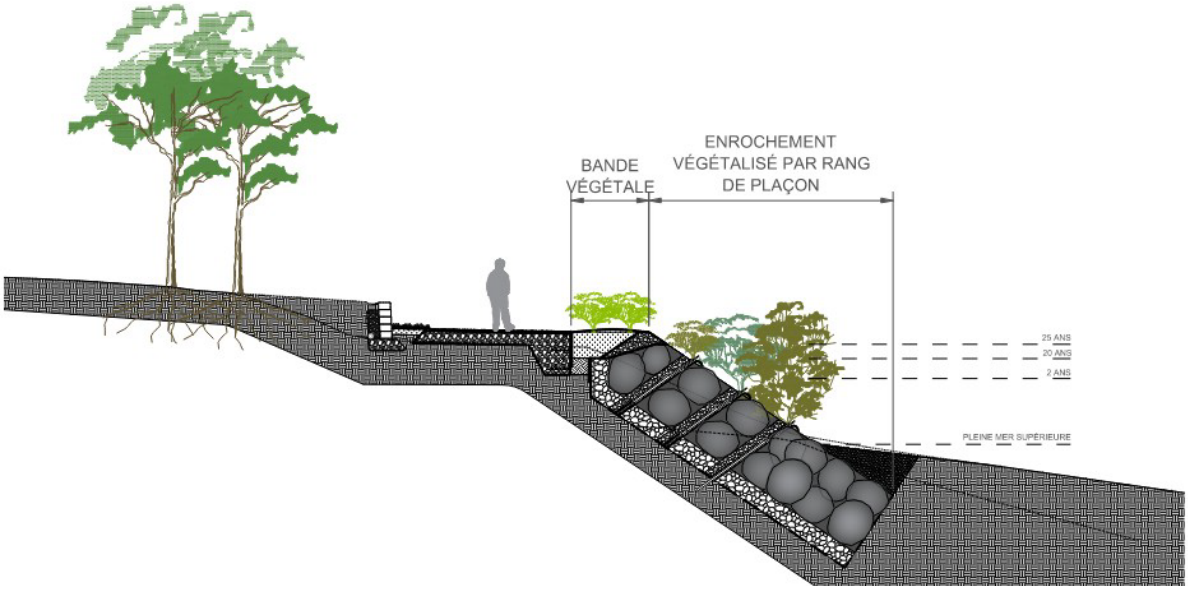


Tronçon 2

Au tronçon 2, l'enrochement existant est conservé et, au besoin, réparé avant d'être végétalisé. Des arbustes en pot ou des plançons sont insérés dans les interstices. En crête de talus, des végétaux supplémentaires sont installés à l'intérieur d'un treillis métallique.

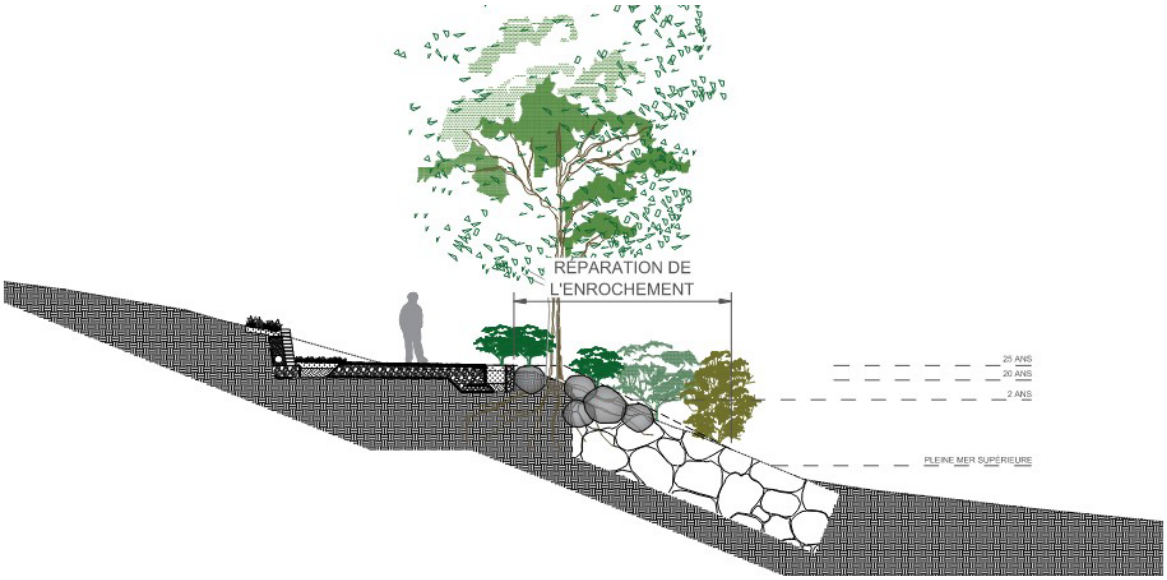

Tronçon 3

Le tronçon 3 est constitué d'enrochements végétalisés au moyen de lits de plants et de plançons auquel s'ajoute une bande végétalisée aménagée en haut de talus.

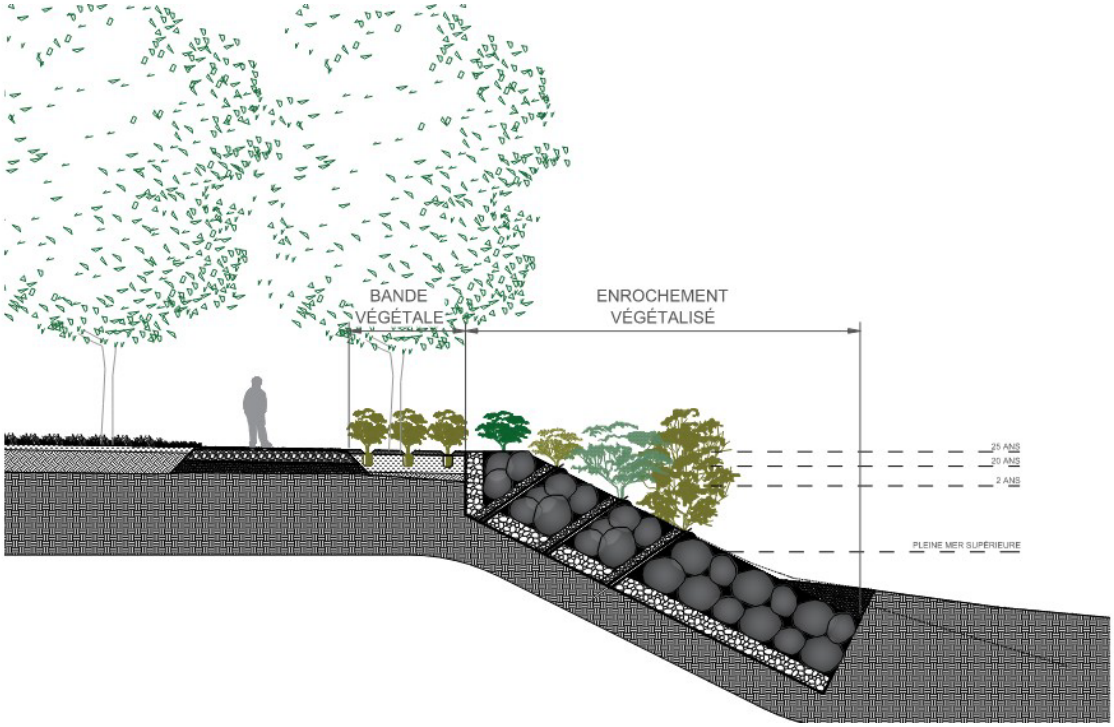

2.1.2 Remise en état des lieux

Dans le cadre de la Phase 1, des interventions de remise en état ont également été réalisées dans les espaces « parc » afin de favoriser la renaturalisation du milieu. Des plantations d'arbres et d'arbustes ont été effectuées en complément des ouvrages de stabilisation, contribuant à restaurer la couverture végétale et à améliorer l'intégration paysagère du site.

Par ailleurs, certains aménagements fonctionnels ont été ajustés ou remis en état, notamment des accès à la plage ainsi que des accès secondaires. Des travaux d'amélioration du drainage ont également été réalisés, incluant l'installation ponctuelle de dispositifs de gestion des eaux de ruissellement.

Les travaux associés à cette première phase se sont achevés en 2023.

2.2 Travaux réalisés à la Phase 2

La Phase 2 du projet a consisté en la mise en place d'ouvrages de stabilisation des berges sur une longueur totale de 767 m couvrant les tronçons 4 à 7. Cette phase se distingue de la Phase 1 par l'intégration de techniques diversifiées, sélectionnées en fonction des conditions géomorphologiques, hydrauliques et environnementales propres à chaque tronçon.

Les interventions réalisées au cours de cette phase incluent l'installation des ouvrages et dispositifs suivants :

- **Caissons de bois végétalisés**, utilisés comme structures mixtes combinant une fonction de stabilisation mécanique et un support à l'enracinement des végétaux ;
- **Treillis de bois végétalisés**, mis en place pour assurer une stabilisation de surface accrue et permettre l'établissement progressif d'une couverture végétale ;
- **Enrochements végétalisés**, intégrant des plançons enfoncés entre les blocs ainsi que des plantations en pochettes créées dans la matrice rocheuse afin de favoriser l'enracinement en profondeur ;
- **Ouvrages de génie végétal**, tels que les rangs de plançons et les fascines, destinés à stabiliser les sols fins et à limiter l'érosion tout en accélérant le développement de la végétation riveraine ;
- **Végétalisation de berges**, réalisée en haut et en bas de talus, sans recours aux dispositifs de génie végétal, afin d'assurer une couverture herbacée ou arbustive destinée à protéger les sols contre l'érosion superficielle.

La combinaison de ces techniques vise à optimiser la stabilité des berges tout en favorisant leur renaturalisation progressive. L'approche retenue permet également d'améliorer la résilience écologique du milieu, en s'appuyant sur une intégration graduelle de la végétation au sein des ouvrages de stabilisation et en minimisant les impacts environnementaux. La figure ci-dessous localise les tronçons 4 à 7 de la Phase 2.


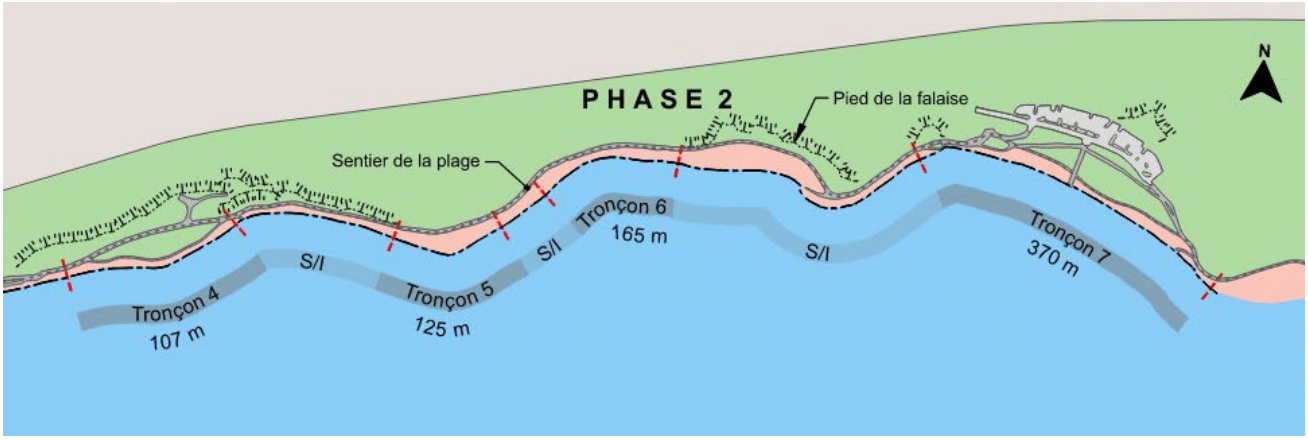


Figure 3 Localisation des tronçons de la Phase 2

2.2.1 Végétalisation des ouvrages


Tronçons 4

Au tronçon 4, la stabilisation des berges est assurée par l'installation de caissons de bois végétalisés. En haut de talus, du génie végétal et une bande arbustive sont aménagés le long du chemin de la plage, contribuant à renforcer la couverture végétale du secteur.

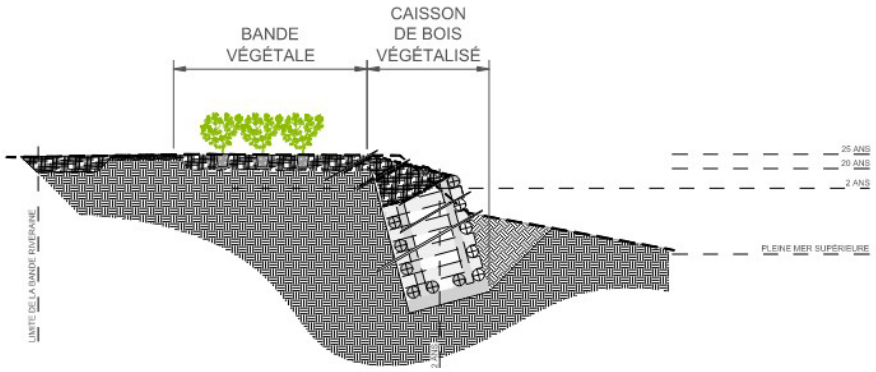


Tronçons 5

Au tronçon 5, les ouvrages de stabilisation des berges sont constitués de treillis de bois végétalisés, auxquels sont intégrés des rangs de plançons et du génie végétal afin d'assurer la stabilisation et la consolidation progressive de la berge.

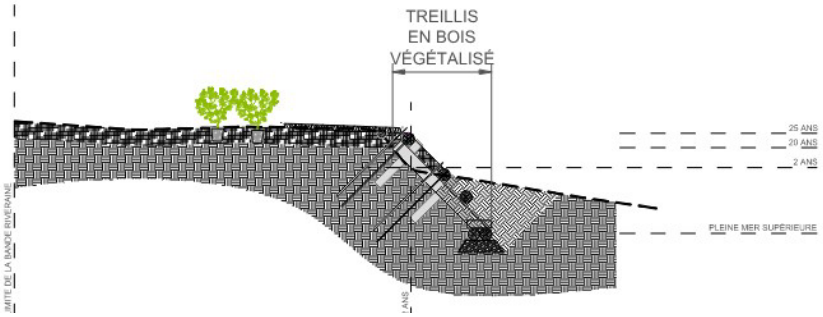


Tronçon 6

Au tronçon 6, la stabilisation des berges repose sur une combinaison d'enrochements végétalisés en bas de talus et de treillis de bois végétalisés aménagés au milieu et en haut de talus. Les plantations sont constituées de rangs de plançons intégrés aux enrochements, tandis que le treillis est végétalisé au moyen de matelas de plançons. En haut du treillis de bois, du génie végétal et une bande arbustive sont également implantés afin de renforcer la couverture végétale du secteur.

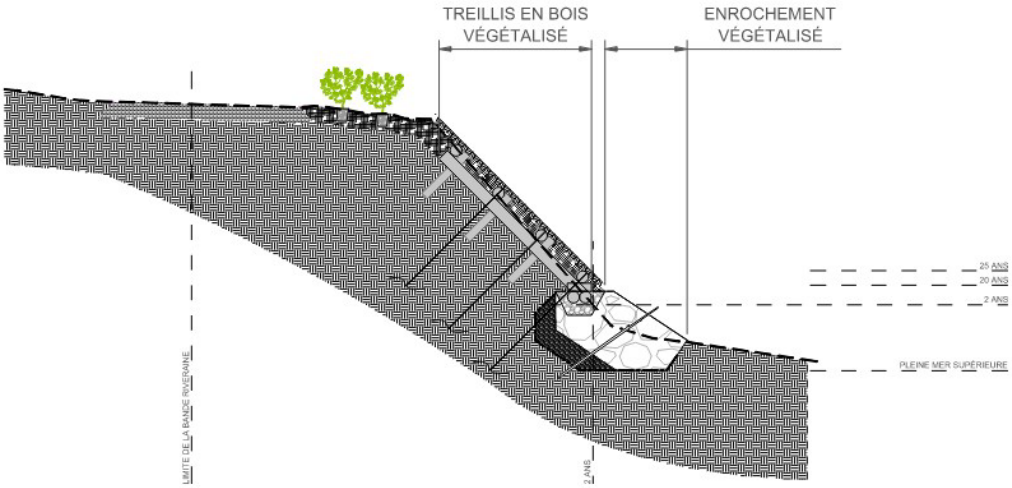

Tronçon 7

Au tronçon 7, une portion de la berge est stabilisée au moyen de treillis de bois végétalisés (tronçon 7a) tandis qu'une autre section est aménagée au moyen d'enrochements végétalisés (tronçon 7 b) permettant d'adapter les techniques de stabilisation aux conditions locales du site.

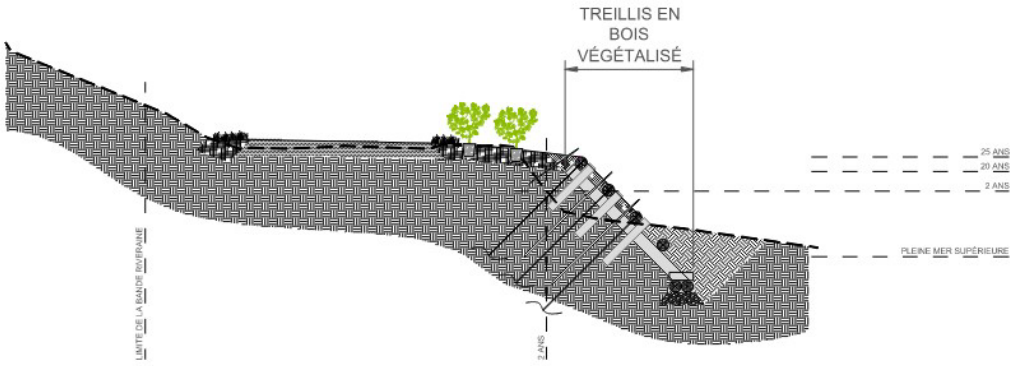

2.2.2 Remise en état des lieux

Le **plan de remise en état** a été élaboré pour répondre aux exigences du Ministère et du guide associé. Des arbres et des arbustes ont été plantés dans le secteur du parc afin de favoriser la naturalisation du site et d'assurer la remise en état des lieux.

Par ailleurs, le projet comprend également la réfection du chemin principal menant à la plage, l'amélioration des sentiers d'accès, ainsi que l'installation d'infrastructures de drainage, notamment des ponceaux, un bassin de captation de sédiments et des tranchées drainantes. Des travaux de mise à jour du réseau d'éclairage public ont aussi été réalisés, incluant la mise en place de nouveaux conduits et la relocalisation de certains lampadaires.

L'ensemble des travaux de la Phase 2 s'est achevé en 2024.

3 Suivi de la végétalisation des ouvrages et du plan de remise en état des lieux

3.1 État de référence

3.1.1 Végétalisation des ouvrages (berges)

Dans le secteur visé par la Phase 1, les berges étaient initialement composées d'enrochements non végétalisés. L'analyse du profil des infrastructures existantes a révélé que certains segments se situaient sous l'élévation de conception, entraînant une vulnérabilité accrue aux sollicitations hydrauliques. Par ailleurs, la rive attenante au sentier était exposée au franchissement des vagues et au ruissellement de surface, cette condition étant attribuable à l'absence de raccordement adéquat entre l'enrochement et l'élévation du sentier existant.

Ainsi, en plus de la végétalisation des enrochements et de la mise en place d'une clé d'ancrage, la reconstruction des enrochements visait également à corriger ces deux défaillances structurelles afin d'assurer une stabilisation durable des berges et une meilleure résilience du site.

Pour la Phase 2, aucun ouvrage de stabilisation n'était présent dans les tronçons 4 à 7 avant l'intervention. Ceux-ci se trouvaient à l'état naturel ou dans un état d'érosion nécessitant la mise en place de nouvelles mesures de stabilisation adaptées aux conditions locales.

3.1.2 Remise en état des lieux (parc)

Le parc est un lieu aménagé à plus de 75 %, ce qui influence la composition végétale observée. La strate herbacée est dominée par le gazon, diverses graminées, l'asclépiade et le tussilage. La strate arbustive est principalement composée de vinaigrier, de rosier inerme, de physocarpe à feuille d'obier, de cornouiller stolonifère, de vignes et de chèvrefeuille.

La strate arborescente, quant à elle, comporte de nombreux segments où les arbres sont dispersés. Les essences les plus fréquentes en bordure de la berge sont le chêne rouge, l'érable à sucre, le frêne de Pennsylvanie, le peuplier faux-tremble, le tilleul d'Amérique et l'orme d'Amérique, ce dernier étant l'arbre emblématique de la Ville de Québec.

Ce milieu, considéré comme perturbé, résulte d'interventions telles que des coupes totales suivies de plantations. Il s'agit donc « d'un milieu majoritairement aménagé et régulièrement entretenu, où cohabitent des espèces indigènes, des espèces introduites et certaines espèces exotiques envahissantes » (rapport d'enquête et d'audience publique, 2021, Stantec).

3.2 Méthodologie

Le suivi environnemental des ouvrages végétalisés et des interventions de remise en état repose sur une combinaison d'inspections visuelles systématiques et de mesures normalisées. Cette approche permet d'évaluer, pour chaque tronçon et en fonction du type d'ouvrage observé, la performance des techniques de stabilisation mises en place, l'efficacité de la végétalisation des berges ainsi que l'évolution des zones restaurées. Les inspections incluent notamment l'observation de l'état structural des ouvrages, la vérification de la survie et de la croissance des végétaux, la détection de signes d'érosion ou de dégradation, ainsi que l'identification d'éventuelles espèces indésirables ou envahissantes. Les mesures normalisées comprennent, entre autres, des relevés de couverture végétale, des mesures de croissance et des suivis photographiques géoréférencés. Cette méthodologie assure un suivi rigoureux et reproductible des performances environnementales, permettant d'ajuster rapidement les mesures d'entretien ou les interventions correctives, lorsque nécessaire.

3.2.1 Calendrier des visites

Les relevés ont été effectués sur une période de cinq jours, répartis entre le début du mois d'octobre et la mi-novembre 2025. Les inspections terrain ont été réalisées aux dates suivantes :

- 2 octobre 2025 ;
- 3 octobre 2025 ;
- 10 octobre 2025 ;
- 13 novembre 2025 ;
- 14 novembre 2025.

Cette répartition temporelle permet de documenter l'état des ouvrages et de la végétation dans des conditions saisonnières distinctes, offrant ainsi une lecture plus complète de la performance des interventions et de l'évolution du couvert végétal.

3.2.2 Échantillonnage représentatif

Étant donné que les plantations réalisées dans les ouvrages de stabilisation en berge prennent la forme de **plantations en massif**, tandis que celles effectuées dans le parc, dans le cadre de la remise en état des lieux, correspondent principalement à des **plantations isolées**, deux approches d'échantillonnage distinctes ont été retenues.

Végétalisation des ouvrages de stabilisation

L'échantillonnage a été structuré de manière à représenter l'ensemble des configurations d'aménagement présentes dans les deux phases du projet. Chaque tronçon comporte un type d'ouvrage de stabilisation avec une configuration propre et les plantations y sont organisées selon des patrons d'assemblage variés.

Afin de documenter de manière adéquate les différents milieux de croissance et les types de plantations associés, des transects ont été établis dans chaque patron d'aménagement. Cette approche garantit que l'ensemble des combinaisons entre les ouvrages de stabilisation et les types de plantations est adéquatement représenté. Au total, 19 transects ont été implantés le long de la berge pour couvrir les patrons de plantation des sept tronçons du projet. Le positionnement des transects est effectué par chaînage linéaire à l'aide d'une roue à mesurer. Tous les végétaux interceptant le transect sont ensuite inventoriés, caractérisés et consignés selon une grille d'observation standardisée.

Pour assurer la **reproductibilité** et la **comparabilité interannuelle** des données sur une période de cinq ans, les mêmes transects seront réévalués lors des suivis subséquents afin d'assurer une continuité méthodologique.

Remise en état des lieux

Dans le secteur du parc, l'échantillonnage porte principalement sur des plantations isolées. La géolocalisation des végétaux ciblés par le suivi est réalisée à l'aide d'une géode, permettant une précision adaptée aux suivis d'évolution à long terme.

L'ensemble des arbres plantés dans le cadre du projet a été relevé, mesuré et analysé. Cette approche permet de documenter la croissance individuelle, l'état sanitaire et la performance générale des plantations destinées à soutenir la renaturalisation du parc.

3.2.3 Gestion de l'information

Pour chacun des végétaux évalués, une fiche individuelle a été produite, intégrant sa géolocalisation, des critères visuels normalisés ainsi que des mesures quantitatives pertinentes au suivi. Cette structure d'information permet d'alimenter de manière rigoureuse les analyses historiques visant à suivre l'évolution de la végétation au fil des années.

Au total, 238 fiches individuelles ont été élaborées et sont disponibles à l'**Annexe B - Fiches individuelles des végétaux**. Elles constituent la base de données centrales utilisées pour l'analyse des résultats, assurant la traçabilité des observations, la comparabilité entre les années de suivi et la reproductibilité méthodologique nécessaire à l'évaluation continue de la performance des interventions.

3.2.4 Critères de mesure et d'observation

L'évaluation de la croissance, de la vigueur et de l'état général de chaque plant repose sur une combinaison d'observations visuelles normalisées et de mesures quantitatives. Les critères retenus permettent d'assurer une caractérisation homogène des végétaux et une comparabilité uniforme des données au fil des suivis annuels.

Critères visuels

Les observations visuelles portent sur les éléments suivants :

- **Qualité du bois** : graduée de *haute* à *très faible* ;
- **État de santé général** : gradué de *sain* à *mort* ;
- **Causes probables de dommages**, le cas échéant :
  - aucun dommage observable ;
  - insectes ;
  - maladies ;
  - tiges cassées ;
  - feu ;
  - tronc annelé ;
  - tronc creux ;
  - dommages causés par la faune ;
  - dommages liés à l'activité humaine ;
  - autres causes identifiées en terrain.

Mesures quantitatives

Les mesures suivantes sont prises pour quantifier l'évolution individuelle des plants :

- Diamètre à hauteur de poitrine (DHP) ;
- Rayon du couvert (houppier) ;
- Hauteur de tige ;
- Nombre de tiges.

Ces données permettent de documenter la croissance structurale, d'identifier les tendances d'établissement et de comparer l'évolution des végétaux entre les années de suivi.

3.2.5 Outillage

Les outils suivants ont été utilisés pour la géolocalisation, les mesures et l'évaluation des végétaux dans le cadre du suivi environnemental :

- Géode ;
- Ruban à mesurer ;
- Roue à mesurer ;
- Clé d'identification des espèces ;
- Fiches normalisées d'inventaire ;
- Bonbonne de peinture d'arpentage (marquages ponctuels) ;
- Plans « tel que construit » ;
- Appareil photo et tablette numérique (documentation photographique géoréférencée).

Cet ensemble d'outils assure la précision des relevés, la reproductibilité des observations et la fiabilité des données utilisées dans l'analyse historique.

3.2.6 Critère d'évaluation de la progression des végétaux

Comme présenté dans l'introduction du présent document, le programme de suivi environnemental vise l'atteinte des objectifs suivants :

- **Objectif 1** : Assurer la survie des végétaux plantés lors de la réalisation des travaux ;
- **Objectif 2** : Vérifier la progression de leur dispersion dans les ouvrages de stabilisation et en haut de talus ;
- **Objectif 3** : Évaluer la qualité de la reprise végétale ;
- **Objectif 4** : Formuler des recommandations relatives à l'entretien des végétaux et aux correctifs à envisager, le cas échéant.

Étant donné que cette campagne constitue la première année du plan de suivi quinquennal, elle a pour fonction d'établir un portrait diagnostique initial de la reprise végétale. Ce portrait repose à la fois sur les observations terrain et sur les mesures quantitatives recueillies.

L'évaluation de la progression des végétaux s'appuie ainsi sur :

- la survie et la vitalité des plants observés ;
- la croissance mesurable (hauteur, diamètre, houppier, nombre de tiges) ;
- la capacité de colonisation ou de dispersion dans les ouvrages de stabilisation et en haut de talus ;
- la qualité de la reprise selon les critères visuels normalisés ;
- l'identification de contraintes (ex. concurrence végétale, stress hydrique, bris physiques, maladies) ;
- les besoins d'entretien ou de corrections, documentés à partir des observations géoréférencées.

Ces éléments serviront de référence pour les suivis subséquents, permettant de mesurer l'évolution de la végétation au fil des années et de valider l'efficacité des techniques de stabilisation et de remise en état mises en œuvre dans chaque tronçon.

3.2.7 Critères de croissance et de développement

L'évaluation de la reprise végétale s'appuie sur un ensemble d'indicateurs permettant de suivre de manière cohérente la croissance et le développement des plantations mises en place dans les ouvrages de stabilisation et dans le secteur du parc. Les mesures recueillies (hauteur, largeur du houppier et nombre de tiges) sont analysées pour chaque espèce, ce qui permet de dégager des tendances générales de croissance et de mettre en relief les secteurs où les végétaux présentent une reprise satisfaisante ou, au contraire, des signes de stress nécessitant un suivi plus étroit.

La performance de chaque individu est également appréciée à partir d'une comparaison avec les dimensions attendues à maturité pour son espèce. Exprimée en pourcentage, cette approche fournit une base simple et objective pour mesurer la vigueur relative des plants et comparer leur développement d'un tronçon à l'autre. Comme les plantations des phases 1 et 2 ont été réalisées à un an d'intervalle, elles sont analysées séparément afin de respecter leur contexte d'implantation.

Les seuils interprétatifs retenus sont :

- **Croissance insuffisante** : 0 % à 25 % des dimensions à maturité ;
- **Croissance suffisante** : 25 % et plus des dimensions à maturité.

Ces indicateurs serviront de point de comparaison pour les suivis à venir et permettront de suivre l'évolution dendrométrique de chaque individu, notamment la croissance verticale, l'expansion du houppier et la multiplication des tiges, selon les besoins propres à chaque type d'ouvrage.

Critères propres à la remise en état des lieux

Dans le parc, la remise en état repose principalement sur des plantations isolées visant autant la restauration écologique que l'amélioration de la qualité paysagère. L'évaluation porte donc d'abord sur la **vigueur des arbres et arbustes** : taux de survie, état sanitaire, développement initial et stabilité. Ces données permettent de valider la réussite de l'implantation et d'identifier rapidement les individus nécessitant une intervention ou un remplacement.

L'intégration paysagère est également un critère important, particulièrement en raison des objectifs de mise en valeur du site. L'organisation des plantations doit respecter les intentions du concept, notamment la création d'**ouvertures visuelles vers le paysage fluvial**, la cohérence des alignements et la qualité esthétique générale des aménagements. L'analyse tient compte de la densité, du positionnement des végétaux et de leur capacité à s'inscrire harmonieusement dans les espaces du parc.

Enfin, la **performance écologique** est évaluée au regard de la concurrence exercée par les espèces herbacées, de la présence d'espèces indésirables ou envahissantes, et de la capacité des plantations à stabiliser les sols dans les zones sensibles. Les constats issus de ces observations permettent de formuler des recommandations d'entretien (désherbage, arrosage, ajustement du paillis) ou des mesures correctives ciblées pour assurer la pérennité de la remise en état.

3.2.8 Limitations

Le présent suivi a pour objectif de vérifier l'établissement et le développement des plantations réalisées dans le cadre du projet, ainsi que d'en tirer les enseignements nécessaires pour orienter les suivis ultérieurs. Il convient de préciser qu'une **végétation spontanée** s'est implantée au sein de plusieurs ouvrages. Toutefois, l'évaluation porte **exclusivement sur les végétaux plantés**, conformément au périmètre défini par le programme de suivi environnemental.

Par ailleurs, les valeurs de hauteur et de diamètre à maturité des espèces utilisées peuvent varier selon les sources. Les dimensions de référence retenues dans la présente étude correspondent aux valeurs les plus fréquemment rapportées dans la littérature spécialisée, afin d'assurer une interprétation cohérente et représentative des performances observées.

4 Résultat - Suivi des ouvrages de végétalisation

Ce chapitre présente les résultats du suivi des ouvrages de végétalisation réalisés dans le cadre de la Phase 1. Le suivi permet d'évaluer la performance des interventions, la vigueur des végétaux implantés et leur capacité à s'adapter aux conditions propres aux différents tronçons.

Les mesures recueillies (hauteur, largeur et densité de tiges) sont comparées aux dimensions attendues à maturité afin d'apprécier la progression des espèces et l'efficacité des méthodes d'implantation utilisées. Les sections suivantes offrent un portrait synthèse de l'évolution de la végétalisation et des différences de performance observées entre les ouvrages.

Les bases de données qui ont servi à l'analyse suivante se trouvent à **l'Annexe C – Tableaux synthèses des mesures par espèces.**

4.1 Résultats de la Phase 1 - Végétalisation des ouvrages

***Diervilla lonicera* / Dièreville chèvrefeuille**

Les *Diervilla lonicera*, localisés dans le tronçon 1 au sein des enrochements végétalisés, présentent une croissance plus que satisfaisante. Après seulement deux années de croissance, ces arbustes atteignent presque leurs dimensions finales, témoignant d'une excellente adaptation au milieu.

***Diervilla lonicera* / Dièreville chèvrefeuille**			
	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Tige/m
Moyenne	107	103	10
Dimension à maturité	130	100	
Pourcentage de la dimension à maturité	**83 %**	**103 %**	

***Physocarpus opulifolius* / Physocarpe à feuilles d'obier**

La croissance observée chez le *Physocarpus opulifolius* est jugée satisfaisante. Toutefois, un contraste marqué est relevé entre les plants installés dans des pochettes intégrées à l'enrochement existant du tronçon 2, qui présentent un développement nettement plus limité, et ceux directement implantés dans l'enrochement, qui montrent une vigueur supérieure.

***Physocarpus opulifolius* / Physocarpe à feuilles d'obier**			
	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Tige/m
Moyenne	95	56	2
Dimension à maturité	250	250	
Pourcentage de la dimension à maturité	**38 %**	**23 %**	

***Salix interior* / Saule intérieur**

Les *Salix interior* installés dans les enrochements affichent une croissance vigoureuse, certains individus développant même un tronc bien formé et un nombre élevé de tiges. En revanche, les plants situés en interstice dans le tronçon 2 démontrent un développement plus modeste.

***Salix interior* / Saule intérieur**			
	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Tige/m
Moyenne	204	144	2,2
Dimension à maturité	500	300	
Pourcentage de la dimension à maturité	**41 %**	**48 %**	

***Spiraea alba latifolia* / Spirée à larges feuilles**

Certains individus de *Spiraea alba latifolia* ont atteint plus de 65 % de leur taille finale en seulement deux ans. Comme pour d'autres espèces évaluées, les plants établis au sein d'enrochements existants présentent une croissance plus limitée que ceux plantés dans les zones nouvellement aménagées.

***Spiraea alba latifolia* / Spirée à larges feuilles**			
	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Tige/m
Moyenne	88	59	8
Dimension à maturité	150	150	
Pourcentage de la dimension à maturité	**58 %**	**39 %**	

***Cornus stolonifera* /Cornouiller stolonifère**

Le *Cornus stolonifera* présente une croissance plus que satisfaisante, atteignant 76 % de sa hauteur à maturité après deux ans seulement. Toutefois, comme observés pour d'autres espèces, les individus implantés en pochette au sein de l'enrochement existant montrent une vigueur réduite, se situant sous la moyenne générale.

***Cornus stolonifera* / Cornouiller stolonifère**			
	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Tige/m
Moyenne	151	132	4
Dimension à maturité	200	300	
Pourcentage de la dimension à maturité	**76 %**	**44 %**	

4.2 Résultats de la Phase 2 - Végétalisation des ouvrages

***Physocarpus opulifolius* / Physocarpe à feuilles d'obier**

Les plants installés en phase 2 présentent des performances très similaires à celles observées lors de la Phase 1, bien qu'ils ne comptent qu'une seule saison de croissance. La hauteur moyenne mesurée est légèrement inférieure (-2 %), tandis que la largeur moyenne s'avère légèrement plus élevée (+3 %). On note également une augmentation du nombre moyen de tiges, avec environ cinq unités supplémentaires par mètre linéaire.

***Physocarpus opulifolius* / Physocarpe à feuilles d'obier**			
	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Tige/m
Moyenne	90	65	7
Dimension à maturité	250	250	
Pourcentage de la dimension à maturité	**36 %**	**26 %**	

***Salix interior* / Saule intérieur**

La reprise des *Salix interior* est globalement satisfaisante. Après une seule année, l'ensemble des individus a gagné un minimum de 144 cm en hauteur. Les plants présentant les plus faibles croissances sont localisés dans le tronçon 6, particulièrement dans les secteurs où des matelas de plançons ont été installés.

***Salix interior* / Saule intérieur**			
	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Tige/m
Moyenne	176	59	19,5
Dimension à maturité	500	300	
Pourcentage de la dimension à maturité	**35 %**	**20 %**	

***Spiraea alba latifolia* / Spirée à larges feuilles**

Les *Spiraea alba latifolia* montrent une croissance marquée, atteignant plus de 60 cm en hauteur en un an. Les dimensions observées correspondent à environ 50 % de la hauteur à maturité et 31 % de la largeur à maturité. Avec une moyenne de 44 tiges, cette espèce contribuera rapidement à la mise en place d'une couverture arbustive dense.

***Spiraea alba latifolia* / Spirée à larges feuilles**			
	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Tige/m
Moyenne	75	46	44
Dimension à maturité	150	150	
Pourcentage de la dimension à maturité	**50 %**	**31 %**	

***Cornus stolonifera* /Cornouiller stolonifère**

Les plants ont présenté un gain minimal de 55 cm en hauteur après une année de croissance, atteignant ainsi 46 % de leur hauteur à maturité. Les individus les moins vigoureux se situent dans le tronçon 6, particulièrement au sein des matelas de plançons. À l'instar des Spirées, cette espèce développe un grand nombre de tiges, ce qui favorise une mise en couvert rapide du sol.

***Cornus stolonifera* / Cornouiller stolonifère**			
	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Tige/m
Moyenne	93	84	46
Dimension à maturité	200	300	
Pourcentage de la dimension à maturité	**46 %**	**28 %**	

4.3 Résultat de la remise en état des lieux

La diversité d'essences aménagées est : érable (*Acer sp.*), chêne rouge (*Quercus rubra*), bouleau à papier (*Betula papyrifera*), peuplier faux-tremble (*Populus tremuloides*), thuya (*Thuya occidentalis*), pin blanc (*Pinus strobus*).

Le suivi 2025 indique que les plantations du parc présentent une **reprise satisfaisante.** Les indicateurs sanitaires sont uniformément favorables, avec une qualité du bois cotée 1, un état de santé 0 (sain) et aucune cause de dommage répertorié pour l'ensemble des individus recensés. Les mesures dendrométriques (DHP de 8 à 81 mm, rayons de couvert de 22 à 243 cm) confirment une installation adéquate, notamment chez les espèces pionnières dont l'expansion foliaire est déjà notable.

En somme, la remise en état du parc présente une **performance élevée**, caractérisée par un taux de survie de 100 %, l'absence de stress ou de dommages notable et une cohérence écologique avec le milieu d'accueil. Les conditions observées répondent aux objectifs de naturalisation et établissent une base robuste pour la poursuite du suivi écologique.

Les sections suivantes présentent un portrait global de chaque tronçon et illustrent, à l'aide de photographies, l'ensemble des transects réalisés. Les mesures correctives ou l'état jugé satisfaisant y sont également indiqués.

4.4 Portrait général par tronçon – Phase 1

La figure ci-dessous présente la localisation des transects de la phase 1.

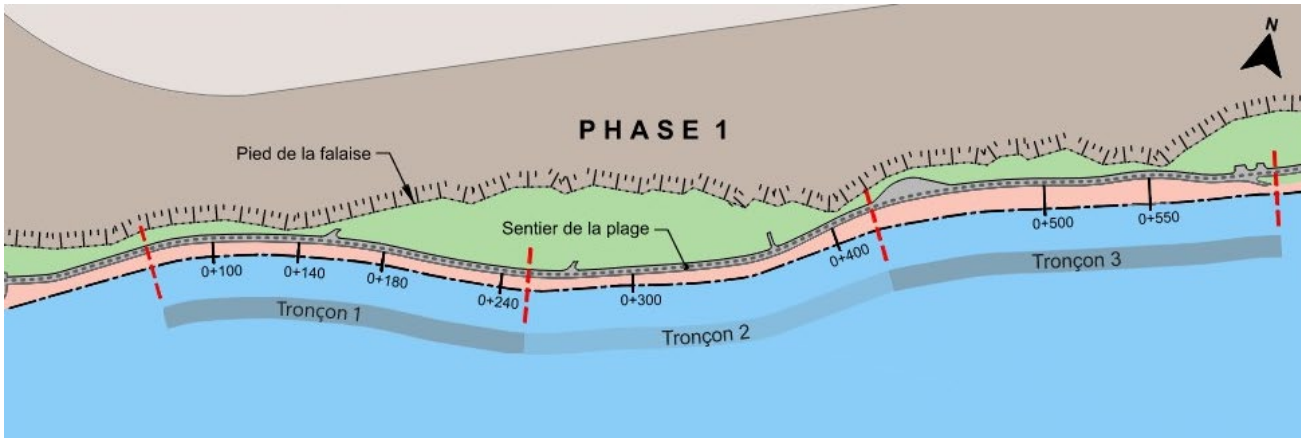


Figure 4 Localisation des transects de la phase 1

4.4.1 Tronçon 1 - Enrochements végétalisés - chaînage 0+075 à 0+250

L'ensemble des transects indique une **reprise généralement satisfaisante**, à l'exception du segment 0+074 à 0+090 où la reprise est qualifiée de **faible**. Les autres transects (0+100, 0+140, 0+180, 0+240) présentent un **développement satisfaisant**, témoignant d'une bonne adaptation des plantations aux conditions d'enrochement nouvellement aménagé.

Segment chaînage 0+074 @ 0+090

- Méthode de stabilisation : enrochement végétalisé
- Commentaire : peu de reprise dans l'enrochement
- Mesures correctives proposées : Reconstituer les poches de sol et procéder à la replantation à l'aide de plants ou de plançons de calibre supérieur, tout en rétablissant des conditions d'humidité favorables. Des ancrages ou des pesées adéquates pourraient être installés afin de maintenir les végétaux en place malgré l'action des marées et des glaces.





Transect chaînage 0+100

- Méthode de stabilisation : enrochement végétalisé
- Développement jugé satisfaisant. Aucun correctif n'est recommandé à ce stade, les conditions de croissance et de reprise étant conformes aux attentes.







Transect chaînage 0+140

- Méthode de stabilisation : enrochement végétalisé
- Développement jugé satisfaisant. Aucun correctif n'est recommandé à ce stade, les conditions de croissance et de reprise étant conformes aux attentes.





Transect chaînage 0+180

- Méthode de stabilisation : enrochement végétalisé
- Développement jugé satisfaisant. Aucun correctif n'est recommandé à ce stade, les conditions de croissance et de reprise étant conformes aux attentes.





Transect chaînage 0+240

- Méthode de stabilisation : enrochement végétalisé
- Développement jugé satisfaisant. Aucun correctif n'est recommandé à ce stade, les conditions de croissance et de reprise étant conformes aux attentes.





4.4.2 Tronçon 2 - Enrochements existants végétalisés par interstices - chaînage 0+250 à 0+420

Les transects 0+300 et 0+400 révèlent un **développement insatisfaisant**. Ces observations corroborent les constats détaillés à la section 4.1, où les espèces en pochettes (interstices) au sein de l'enrochement existant affichaient une vigueur inférieure à celle observée dans les enrochements neufs.

Transect chaînage 0+300

- Méthode de stabilisation : enrochement existant avec pochette de plantation et végétalisation en haut de talus
- Commentaire : développement insatisfaisant
- Mesures correctives proposées : reconstituer les poches de sol et procéder à la replantation à l'aide de plants ou de plançons de calibre supérieur, tout en rétablissant des conditions d'humidité favorables. Des ancrages ou des pesées adéquates pourraient être installés afin de maintenir les végétaux en place malgré l'action des marées et des glaces.








Transect chaînage 0+400

- Méthode de stabilisation : enrochement existant avec pochette de plantation et végétalisation en haut de talus
- Commentaire : **développement insatisfaisant**
- Mesures correctives proposées : Reconstituer les poches de sol et procéder à la replantation à l'aide de plants ou de plançons de calibre supérieur, tout en rétablissant des conditions d'humidité favorables. Des ancrages ou des pesées adéquates pourraient être installés afin de maintenir les végétaux en place malgré l'action des marées et des glaces.

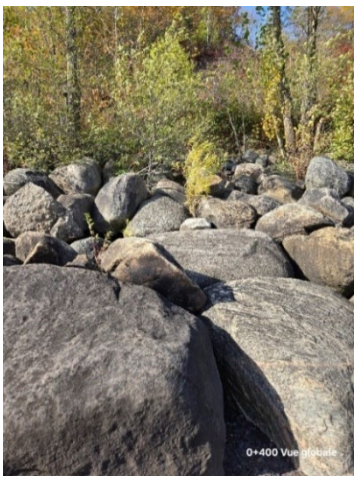





4.4.3 Tronçon 3 - Enrochements végétalisés - chaînage 0+420 à 0+610

Des résultats contrastés sont notés : un transect révèle un développement **insatisfaisant**, alors qu'un autre indique un développement **satisfaisant**. Cette variabilité suggère une influence marquée du contexte micro-stationnel (profondeur de sol, exposition, humidité) et du mode d'implantation.

Transect chaînage 0+500

- Méthode de stabilisation : enrochement existant avec pochette de plantation et végétalisation en haut de talus
- Commentaire : **développement insatisfaisant**
- Mesures correctives proposées : Reconstituer les poches de sol et procéder à la replantation à l'aide de plants ou de plançons de calibre supérieur, tout en rétablissant des conditions d'humidité favorables. Des ancrages ou des pesées adéquates pourraient être installés afin de maintenir les végétaux en place malgré l'action des marées et des glaces.

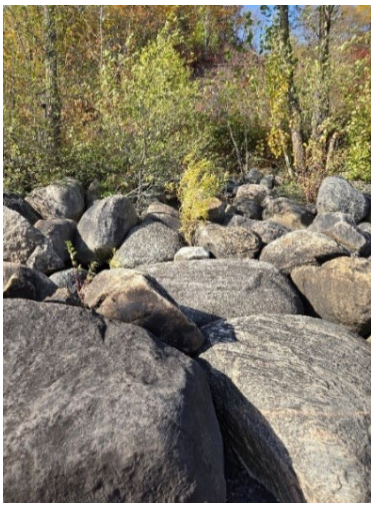





Transect chaînage 0+550

- Méthode de stabilisation : enrochement existant avec pochette de plantation et végétalisation en haut de talus
- Développement jugé satisfaisant. Aucun correctif n'est recommandé à ce stade, les conditions de croissance et de reprise étant conformes aux attentes.





4.5 Portrait général par tronçon – Phase 2

La figure ci-dessous présente la localisation des transects de la Phase 2.

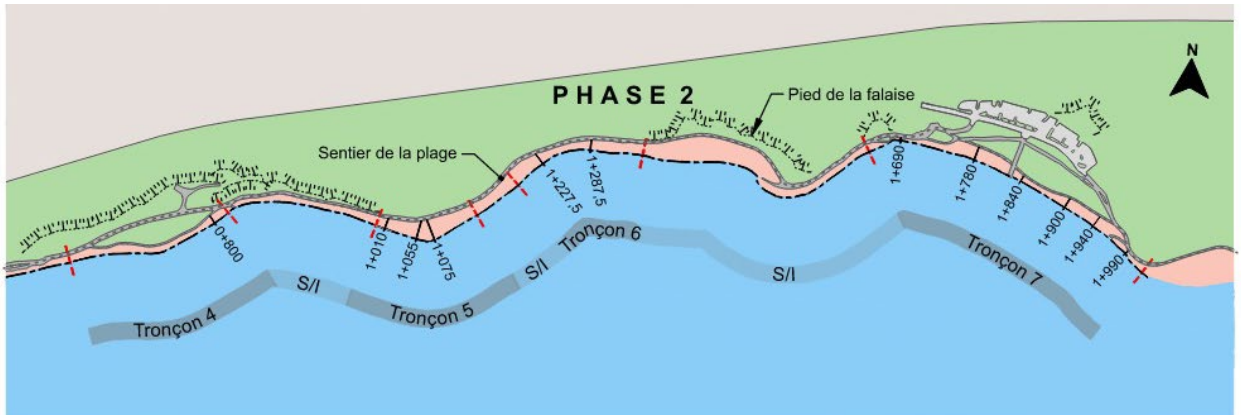


Figure 5 Localisation des transects de la phase 2

4.5.1 Tronçon 4 - Caissons de bois végétalisés - chaînage 0+715 à 0+822

La végétalisation des caissons du tronçon 4 indique une **reprise généralement satisfaisante**.

Transect chaînage ±0+800

- Méthode de stabilisation : caisson de bois végétalisés
- Développement jugé satisfaisant. Aucun correctif n'est recommandé à ce stade, les conditions de croissance et de reprise étant conformes aux attentes.



4.5.2 Tronçon 5 – Treillis de bois végétalisés - chaînage ch. 1+005 à 1+130

Le développement est **globalement satisfaisant**, avec une **colonisation arbustive spontanée** de la berge au chaînage ±**1+075**, indicatrice d'une dynamique végétale active. Quelques enjeux localisés sont toutefois présents :

- **Découvrement** (déchirure de la membrane de fibre de coco) observé au chaînage ±1+055 (intervention à planifier).
- **Espèces végétales exotiques envahissantes** présentes (contrôle requis).

Transect chaînage ±1+010

- Méthode de stabilisation : treillis de bois végétalisés
- Développement jugé satisfaisant. Aucun correctif n'est recommandé à ce stade, les conditions de croissance et de reprise étant conformes aux attentes.





Transect chaînage ±1+055

- Méthode de stabilisation : treillis de bois végétalisés
- Développement jugé satisfaisant. Aucun correctif n'est recommandé à ce stade, les conditions de croissance et de reprise étant conformes aux attentes. À noter qu'il y a découvrement (déchirure de la membrane de fibre de coco) du treillis de bois.





Transect chaînage ±1+075

- Méthode de stabilisation : treillis de bois végétalisés
- Développement jugé satisfaisant. Aucun correctif n'est recommandé à ce stade, les conditions de croissance et de reprise étant conformes aux attentes.






4.5.3 Tronçon 6 - Enrochements végétalisés (bas) et treillis de bois (milieu/haut) - chaînage 1+190 à 1+355

Les stations 1+227 (treillis de bois) et 1+287 (enrochement en bas de talus et treillis de bois en milieu et haut) affichent un développement satisfaisant. Cette configuration mixte favorise l'ancrage racinaire en pied de talus et l'occupation végétale en milieu/haut de profil.

Transect chaînage 1+227

- Méthode de stabilisation : treillis de bois végétalisés
- Développement jugé satisfaisant. Aucun correctif n'est recommandé à ce stade, les conditions de croissance et de reprise étant conformes aux attentes. À noter que des plantes envahissantes ont été observées.



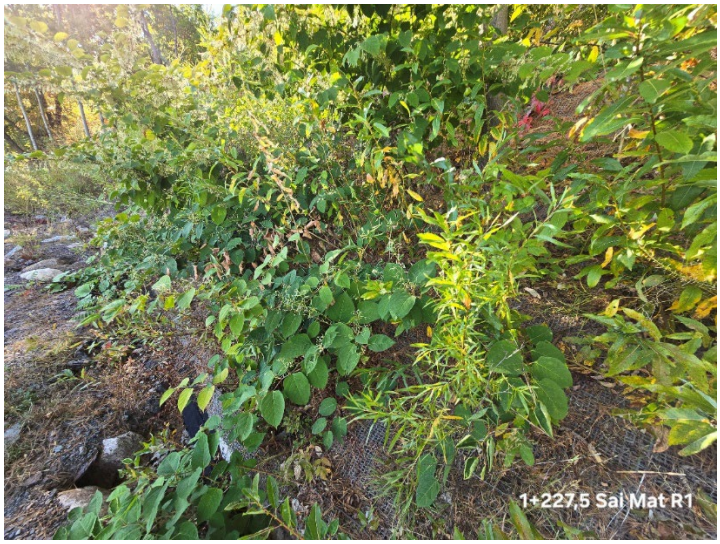


Transect chaînage 1+288

- Méthode de stabilisation : enrochement végétalisé en bas de talus et treillis de bois végétalisé en milieu et en haut de talus
- Développement jugé satisfaisant. Aucun correctif n'est recommandé à ce stade, les conditions de croissance et de reprise étant conformes aux attentes.





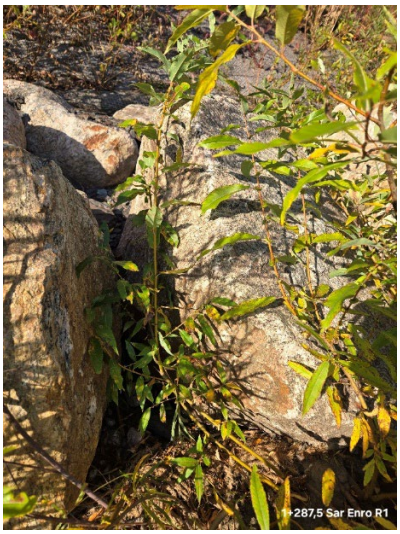

4.5.4 Tronçon 7 -Treillis de bois et enrochements végétalisés - chaînage 1+650 à 2+020

Les observations aux chaînages 1+690, 1+780, 1+840, 1+900, 1+940 et 1+990 indiquent un développement **satisfaisant** sur l'ensemble des sous-secteurs, confirmant la **bonne compatibilité** des techniques employées avec les conditions locales.

Transect chaînage 1+690

- Méthode de stabilisation : enrochement végétalisé et treillis de bois végétalisés.
- Développement jugé satisfaisant. Aucun correctif n'est recommandé à ce stade.







Transect chaînage 1+780

- Méthode de stabilisation : enrochements végétalisés et treillis de bois végétalisés.
- Développement jugé satisfaisant. Aucun correctif n'est recommandé à ce stade, les conditions de croissance et de reprise étant conformes aux attentes.







Transect chaînage 1+840

- Méthode de stabilisation : enrochements végétalisés et treillis de bois végétalisés.
- Développement jugé satisfaisant. Aucun correctif n'est recommandé à ce stade, les conditions de croissance et de reprise étant conformes aux attentes.





Transect chaînage 1+900

- Méthode de stabilisation : enrochements végétalisés et treillis de bois végétalisés.
- Développement jugé satisfaisant. Aucun correctif n'est recommandé à ce stade, les conditions de croissance et de reprise étant conformes aux attentes.





Transect chaînage 1+940

- Méthode de stabilisation : enrochements végétalisés et treillis de bois végétalisés.
- Développement jugé satisfaisant. Aucun correctif n'est recommandé à ce stade, les conditions de croissance et de reprise étant conformes aux attentes.







Transect chaînage 1+990

- Méthode de stabilisation : enrochement végétalisé et treillis de bois végétalisés.
- Développement jugé satisfaisant. Aucun correctif n'est recommandé à ce stade, les conditions de croissance et de reprise étant conformes aux attentes.





4.6 Portrait général - Remise en état des lieux (Phases 1 et 2)

Les aménagements restaurés sont **fonctionnels** (gestion hydrique améliorée, continuités paysagères rétablies) et soutiennent la **résilience écologique** du site, tout en respectant les intentions de **mises en scène paysagères** (ouvertures visuelles vers le fleuve) définies au plan de remise en état.

4.6.1 Taux de survie des végétaux plantés

L'évaluation des 238 végétaux recensés indique un état de santé optimal, l'ensemble des individus présentant une haute qualité de bois, un état sanitaire jugé sain et aucun signe de dommage observable au moment du relevé.

Ces résultats confirment que les végétaux implantés pour la végétalisation des ouvrages de stabilisation et la remise en état des lieux se sont adéquatement adaptés aux conditions du site. Bien que certains secteurs présentent une croissance légèrement moins soutenue, la vigueur globale demeure caractéristique d'une implantation réussie et d'une capacité de croissance satisfaisante lors d'un premier cycle de suivi.

La couverture végétale en développement contribue déjà à :

- Renforcer l'intégration visuelle des aménagements au paysage riverain ;
- Améliorer la stabilité progressive des berges grâce à l'enracinement ;
- Soutenir la restauration écologique par l'établissement d'une structure végétale.

4.6.2 Succession végétale naturelle et colonisation spontanée

Au tronçon 5, les observations indiquent la mise en place d'un processus actif de succession végétale naturelle. Des espèces implantées dans le cadre du projet, notamment *Salix interior* (saule intérieur) et *Cornus stolonifera* (cornouiller stolonifère), ont commencé à coloniser spontanément la berge au-delà des zones initialement plantées. Cette expansion témoigne d'une bonne adaptation des espèces utilisées et d'une dynamique écologique favorable.

Ces espèces pionnières sont reconnues pour leur capacité à s'établir rapidement sur des substrats meubles ou récemment perturbés. Leur système racinaire dense, traçant et extensif contribue à stabiliser progressivement les sols en augmentant la cohésion du matériau, tout en limitant l'érosion superficielle. Cette stabilisation végétale progressive soutient directement la consolidation des ouvrages.

La présence et la dispersion spontanée de ces végétaux constituent un indicateur de résilience écologique. Elles démontrent que les conditions créées par les ouvrages et les travaux de remise en état permettent à la végétation indigène de reprendre naturellement sa place, sans interventions supplémentaires. Cette colonisation contribue à l'installation graduelle d'une structure végétale diversifiée, essentielle à la pérennité des ouvrages, à l'amélioration de la biodiversité locale et au maintien des fonctions écologiques du site riverain.

5 Conclusion et recommandations

5.1 Interprétation des résultats

L'analyse menée sur l'ensemble du site confirme une reprise végétale globalement excellente, soutenue par un état sanitaire optimal des 238 végétaux évalués. Les techniques employées (enrochements végétalisés, caissons de bois végétalisés, treillis de bois végétalisés et génie végétal par rang de plançons, fascines, plantations en pochettes (interstices) ont permis une implantation efficace de la végétation et contribuent déjà à la stabilisation progressive des berges, à la réduction de l'érosion et à l'amélioration de la qualité écologique du site.

La présence de végétation spontanée, particulièrement au tronçon 5, constitue un indicateur positif de résilience écologique et confirme que les conditions créées par les ouvrages favorisent le rétablissement des processus naturels de succession végétale.

Malgré cette performance globale, certains enjeux localisés ont été relevés :

- Phase 1 - Tronçon 1 - chaînage 0+074 à 0+090 : la reprise y est plus faible. Cette situation pourrait être attribuable à un volume de sol insuffisant entre les blocs, un niveau d'humidité plus faible, ou une exposition accrue au mouvement des glaces et des marées.
- Phase 1 - Tronçon 2 (enrochement existant) : les plantations en pochettes (interstices) montrent une reprise inférieure aux plants installés dans de nouveaux enrochements, ce qui pourrait être dû à des contraintes physiques inhérentes à la structure rocheuse existante (faible profondeur de sol, poches irrégulières, drainage accéléré).
- Phase 1 - Tronçon 3 : la vigueur réduite de certains plants semble liée à un apport hydrique irrégulier et un assèchement plus sévère.

La présence ponctuelle d'espèces végétales exotiques envahissantes (notamment observées aux tronçons 5 et 6) demeure un facteur à surveiller, car leur compétition peut compromettre la croissance des espèces indigènes implantées si aucun contrôle n'est réalisé.

5.2 Comparaison avec les objectifs écologiques du projet

L'analyse comparative entre l'état de référence, les hypothèses formulées dans le cadre des autorisations ministérielles et les résultats observés lors de la présente campagne de suivi permet d'évaluer la conformité écologique des interventions ainsi que la performance réelle des plantations associées aux ouvrages de stabilisation.

Comparaison avec l'état de référence

L'état de référence décrivait un milieu composé d'enrochements non végétalisés et présentant des secteurs sous l'élévation de conception, vulnérables aux sollicitations hydrauliques. Le milieu était marqué par une végétation déstructurée, dominée par des espèces pionnières, exotiques ou compétitrices, et montrait une discontinuité écologique entre la rive, le talus et le parc. Finalement, l'état de référence démontrait un milieu exposé à des phénomènes d'érosion active dans plusieurs tronçons.

Les résultats du présent suivi démontrent une situation considérablement améliorée par rapport à cet état initial. Les ouvrages mis en place, combinés à la végétalisation, permettent une meilleure stabilisation du profil de berge, une amélioration du couvert végétal et de la biodiversité, une cohérence écologique nouvelle entre le parc et la berge affiche la mise en marche de processus naturels positifs, tels que la succession végétale spontanée.

Comparaison avec les hypothèses et objectifs du projet

Les hypothèses initiales prévoyaient une reprise progressive des végétaux implantés, un ancrage racinaire permettant d'améliorer la stabilité des ouvrages, une stabilisation des sols par la végétation (en complément des ouvrages physiques), l'amélioration de la qualité écologique du site et finalement, la mise en place de conditions propices à la phytostabilisation, notamment par l'utilisation d'espèces riveraines à enracinement dense.

Les observations terrain confirment la justesse de ces hypothèses. Le taux de survie élévé, la qualité de bois élevée et l'absence de dommages démontrent la validité des techniques d'implantation dans les espaces parc. La croissance mesurée (hauteur, houppier, densité de tiges) confirme une reprise vigoureuse de la plupart des espèces ciblées. De plus, la colonisation spontanée observée au tronçon 5 montre que les ouvrages créent des conditions favorables au retour des processus naturels. La présence d'espèces pionnières comme Salix interior et Cornus stolonifera dans des zones non plantées témoigne d'un début de phytostabilisation naturelle des sols. Finalement, notons que la progression du couvert végétal contribue directement à la réduction de l'érosion, à la fixation des sols et à l'amélioration de la qualité du ruissellement.

Évaluation de l'efficacité des mesures d'atténuation

Les mesures d'atténuation prévues au projet (construction d'enrochements végétalisés par intégration de lits de plançons, installation de caissons et treillis de bois végétalisés, reconstitution d'un couvert végétal indigène, gestion du ruissellement) montrent une efficacité élevée au regard des performances constatées. Les résultats démontrent une bonne adéquation entre les ouvrages choisis et les conditions hydrodynamiques du secteur. Les observations démontrent une stabilisation progressive des surfaces exposées et une réponse végétale conforme aux attentes, malgré les secteurs de reprise plus faible (ex. 0+074-0+090 au tronçon 1 ; plants en pochette (interstices plantés) au tronçon 2 et au chaînage 0+500 du tronçon 3). Ces exceptions demeurent ponctuelles et facilement adressables par des mesures correctives ciblées, déjà identifiées dans les sections précédentes.

Conclusion sur la comparaison

La comparaison entre l'état de référence, les hypothèses de conception et les observations issues du présent suivi indique que les impacts anticipés ont été adéquatement évalués. Les mesures d'atténuation et de stabilisation mises en place sont efficaces, puisque la végétalisation joue son rôle dans la phytostabilisation. Les conditions observées démontrent une tendance positive vers l'atteinte des objectifs écologiques, tant en termes de fonctionnement que de résilience. On remarque donc que les ouvrages sont en voie d'atteindre une fonctionnalité écologique durable, généralement conforme aux exigences du Décret 34-2022 et aux attentes du MELCCFP. En somme, les résultats du premier cycle de suivi confirment que les interventions réalisées s'alignent avec les objectifs du projet et que les conditions actuelles permettent une renaturalisation progressive et structurée du site.

5.3 Influence des conditions hydrologiques et climatiques

Les conditions hydrodynamiques du fleuve, notamment le mouvement des glaces, les variations du niveau d'eau, les marées et les événements de ruissellement intense, influencent directement la performance des ouvrages et la reprise des végétaux. Les zones les plus exposées à ces contraintes, généralement en pied d'enrochement ou dans des secteurs insuffisamment alimentés en eau, sont celles où les reprises plus faibles ont été observées. Les paramètres climatiques de la période de croissance évaluée (températures, précipitations, sécheresses ponctuelles) semblent néanmoins avoir permis une implantation générale satisfaisante, sans signe de stress hydrique généralisé.

5.4 Performance des techniques de stabilisation employées

Les résultats révèlent un niveau de performance différent selon les ouvrages. Les treillis et caissons de bois végétalisés ont offert des conditions de croissance particulièrement favorables, avec un nombre de tiges élevé chez les espèces pionnières (*Salix*, *Cornus*), malgré une année de croissance en moins par rapport à la phase 1. Les enrochements végétalisés, bien que très performants dans les secteurs nouvellement aménagés, montrent une vigueur moindre lorsque les plantations sont installées dans des pochettes au sein d'enrochements existants, où la profondeur et la stabilité du sol sont limitées. Les treillis de bois végétalisés et fascines fonctionnent adéquatement, favorisant la stabilisation de surface et la mise en place d'une couverture végétale structurante.

5.5 Facteurs de réussite et contraintes observées

Plusieurs facteurs de réussite appuient les résultats observés. Les méthodes de stabilisation bien adaptées aux conditions locales ont été mises en place, notamment par une sélection d'espèces indigènes adaptées aux conditions riveraines. La qualité initiale des plantations et des matériaux végétaux a également permis une reprise satisfaisante, résultant également des conditions hydrologiques globalement favorables durant la période de croissance. Finalement, le début de succession végétale naturelle exprime cette réussite.

En ce qui concerne les contraintes observées, on remarque notamment un poids qui pourrait être insuffisant ou un ancrage limité de quelques plants et plançons dans certains secteurs. La profondeur ou le volume de sol utilisé dans certaines pochettes pourrait être insuffisant dans les enrochements existants. La présence localisée d'espèces envahissantes a également été notée et nécessite un contrôle. Finalement, quelques secteurs avec un gradient hydrique défavorable, influençant la vigueur de la reprise des végétaux.

5.6 Mesures correctives

Les mesures correctives visent à assurer la reprise des plantations présentant une croissance jugée insuffisante, par la mise en œuvre d'interventions de replantation ciblées et adaptées aux conditions du site. Les secteurs concernés par ces mesures sont localisés entre les chaînages **0+074 à 0+090** et **0+250 à 0+500**. Ils correspondent spécifiquement aux zones de plantation aménagées dans les interstices des enrochements existants, où les conditions d'implantation (faible volume de sol, drainage rapide et contraintes mécaniques) peuvent limiter la reprise initiale des végétaux.

Afin de végétaliser adéquatement ces enrochements, deux techniques complémentaires seront mises en œuvre :

- la plantation en pochettes améliorées dans les interstices entre les roches ;
- l'implantation de plançons dans l'enrochement existant.

Ces techniques seront utilisées de manière combinée et adaptées aux conditions spécifiques du terrain, afin d'optimiser les taux de reprise. Une densité d'implantation d'une plantation aux 3 m linéaires de chaînage est prévue. Il est à noter que la faisabilité comporte un certain degré d'adaptabilité à confirmer, en fonction de l'évolution des conditions du site depuis les travaux de construction.

Les travaux seront réalisés à l'automne 2026, période reconnue comme favorable à l'implantation des plançons.


5.6.1 Plantation en pochettes


Pour favoriser la réussite des plantations en pochette, les objectifs et interventions visés pour optimiser la reprise sont les suivants :

- **Améliorer le lestage des plants en pochette** : installer des pierres d'environ 200 mm de diamètre minimum au-dessus des pochettes. Installer un piquet en bois qui est ancré au sol et attacher la pochette de plantation à ce piquet.
- **Améliorer les conditions hydriques** : créer une pochette qui intègre une pellicule imperméable, biodégradable et perforée (https://duboisag.com/ca_fr/paillis-biodegradable-et-compostable-noir-bio360.html).

- **Augmenter le volume de substrat** : Sélectionner l'emplacement favorable pour l'insertion en cavité de la pochette entre les pierres de l'enrochement existant et assurer un volume minimal de sol de 300 mm x 300 mm x 300 mm. Il est recommandé de planifier ces interventions vers la fin de l'automne.

Voici la coupe qui illustre l'intervention :

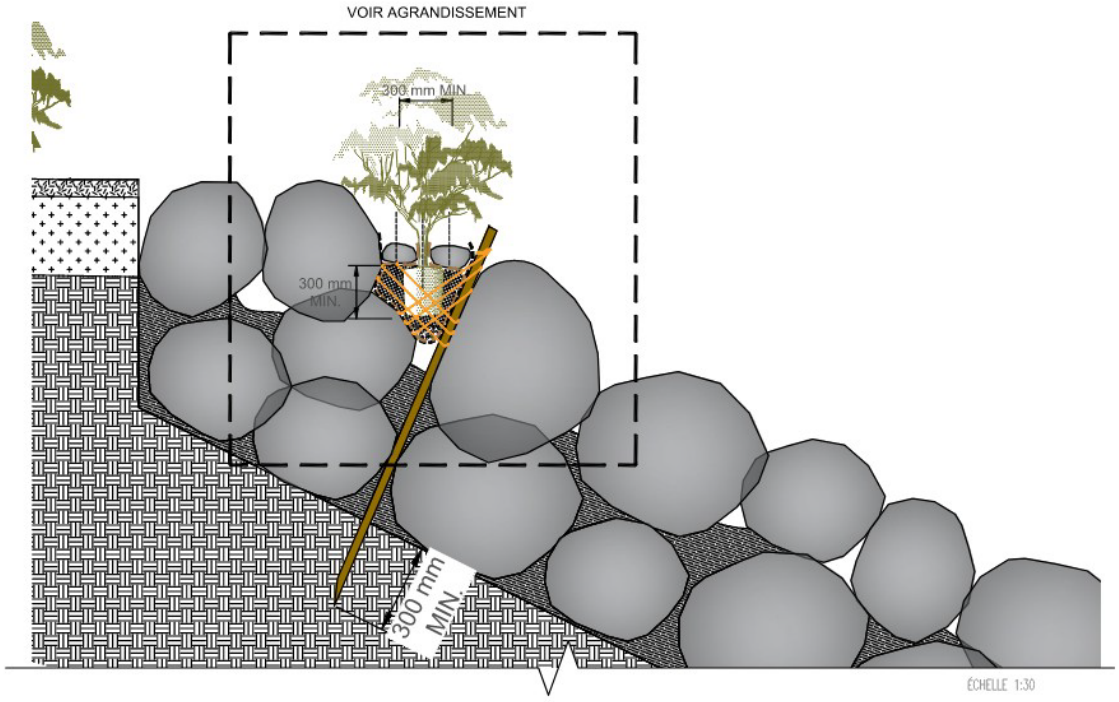

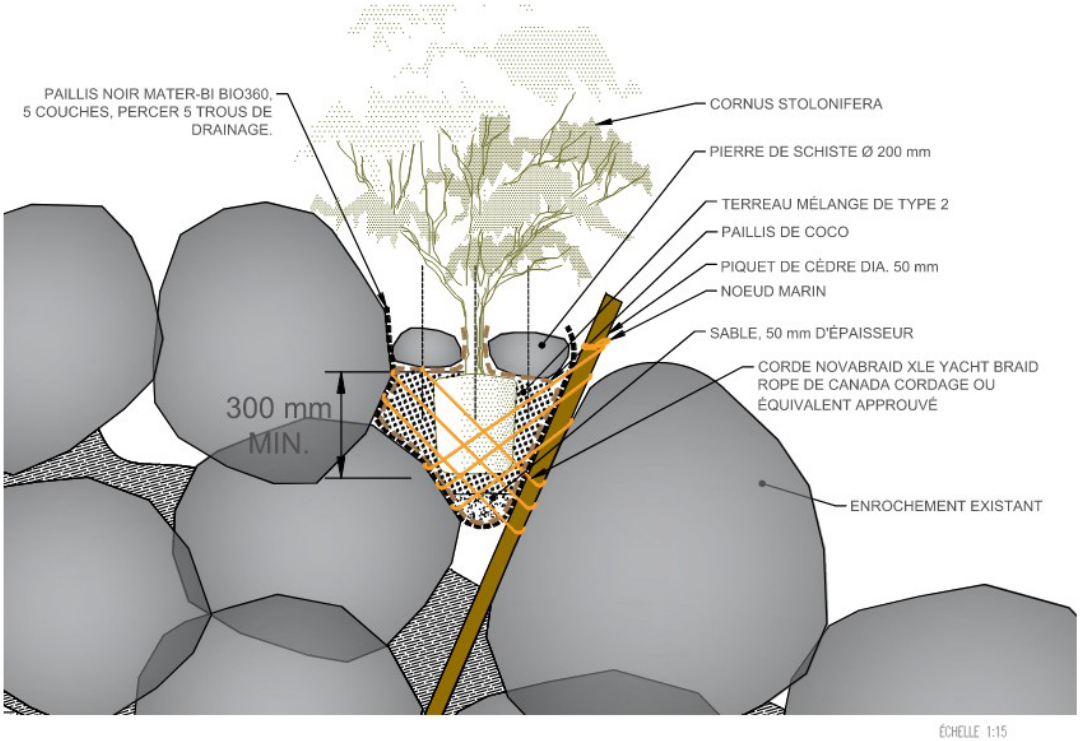


Plançons dans les roches existantes

Cette méthode consiste à réaliser l'insertion de tiges ligneuses (plançons) dans les interstices entre les roches. Une attention particulière sera portée à la profondeur d'implantation, de manière à assurer un contact direct et suffisant entre les plançons et le sol fin sous-jacent. La formation d'un trou de tarière permettra de former des cavités dans le sol qui faciliteront l'insertion adéquate des plançons.

Le contact avec le sol en place est un facteur déterminant pour favoriser l'émission racinaire, assurer une alimentation hydrique suffisante et offrir un ancrage mécanique durable pour les végétaux. La localisation et la profondeur des forages seront ajustées en fonction de la géométrie de l'enrochement et des conditions in situ, afin d'optimiser le taux de reprise et le développement des végétaux. Il est recommandé de planifier ces interventions vers la fin de l'automne.

La coupe suivante illustre cette technique.

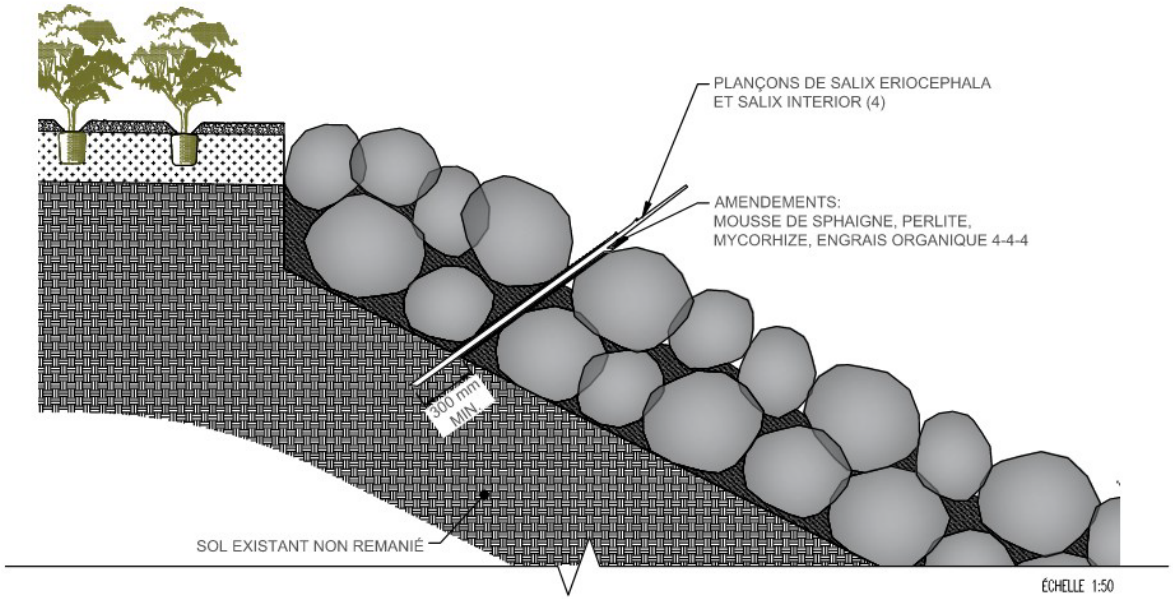

6 Bibliographie

FNX-INNOV. *Devis des clauses techniques particulières. Stabilisation des berges du parc de la plage Jacques-Cartier – Phase 1,* octobre 2022, 502 pages.

FNX-INNOV. *Caractérisation écologique. Stabilisation des berges du parc de la plage Jacques-Cartier - Caractérisation écologique sommaire,* juillet 2023, 86 pages incluant 4 annexes.

FNX-INNOV. *Caractérisation écologique. Stabilisation des berges du parc de la plage Jacques-Cartier - Caractérisation écologique sommaire,* juillet 2023, 86 pages incluant 4 annexes.

FNX-INNOV. *Programme de suivi environnemental. Stabilisation des berges du parc de la plage Jacques-Cartier – Plan de suivi environnemental,* novembre 2022, 21 pages.

FNX-INNOV. *Programme de suivi environnemental. Stabilisation des berges du parc de la plage Jacques-Cartier – Plan de suivi environnemental,* décembre 2023, 23 pages.

STANTEC, 2021, Stabilisation des berges de la plage Jacques-Cartier sur le territoire de la Ville de Québec – Addenda 3 à l'étude d'impact sur l'environnement – Réponses aux questions du 16 mars 2021

STANTEC, 2018, Stabilisation des berges de la plage Jacques-Cartier sur le territoire de la Ville de Québec – Étude d'impact sur l'environnement

StANTEC, 2021, Stabilisation des berges de la plage Jacques-Cartier sur le territoire de la Ville de Québec - Rapport d'enquête et d'audience publique,

GROUPE ABS, 2015, Caractérisation environnementale des sols – phase 2, Plage Jacques-Cartier, arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge à Québec, Québec, N/d : E7-14-1933-13 | Juillet 2015

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC), 2005, Le suivi environnemental – Guide à l'intention de l'initiateur de projet, https://www.environnement.gouv.qc.ca/evaluations/documents/guide-suivi-enviro.pdf

Annexe A

Entretien des végétaux – extrait des clauses techniques particulières du devis pour construction

ENTRETIEN DES OUVRAGES DE PROTECTION

1 GÉNÉRALITÉS

1.1 PORTÉE DES TRAVAUX

.1 L'Entrepreneur assurera, conformément à la présente section, la fourniture de la main d'œuvre, de l'équipement, du matériel et des matériaux nécessaires aux travaux d'entretien des ouvrages de protection suivant :

.1 Travaux d'arrosage la première et la deuxième année ;

.2 Travaux de suivi et d'entretien complet, la première et la deuxième année ;

.2 De façon non limitative, les activités requises par la présente section et incluses au bordereau de soumission sont les suivantes :

.1 Arrosage des plants et plançons des ouvrages végétalisés la première et la deuxième année ;

.2 Arrosage des plants et plançons des ouvrages végétalisés à partir de la troisième année et les années suivantes selon entente avec la Ville ;

.3 Désherbage mécanique ou manuel des mauvaises herbes dans les ouvrages végétalisés pour assurer la bonne reprise des plants et plançons la première et la deuxième année ;

.4 Désherbage mécanique ou manuel des mauvaises herbes dans les ouvrages végétalisés pour assurer la bonne reprise des plants et plançons à partir de la troisième année et les années suivantes selon entente avec la Ville ;

.5 Contrôle ou l'éradication des espèces végétales exotiques envahissantes la première et la deuxième année ;

.6 Contrôle ou l'éradication des espèces végétales exotiques envahissantes à partir de la troisième année et les années suivantes selon entente avec la Ville ;

.7 Inspection des ouvrages lors des visites de suivi et d'entretien ;

.8 Préparation du journal de suivi et d'entretien au moment de chacune des visites au parc (visite d'arrosage et visite d'entretien et de suivi), ceci à chaque année ou un entretien des ouvrages est requis.

1.2 EXIGENCES CONNEXES

.1 Section 35 31 19 : Ouvrages de protection ;

.2 Section 01 45 43 : Protection de l'environnement.

1.3 MESURAGES POUR FIN DE PAIEMENT

.1 Les visites de suivi et d'entretien complet et les visites d'arrosage des ouvrages végétalisés et de stabilisation végétale sont payables dans les frais généraux de l'Entrepreneur.

1.4 DÉFINITIONS

.1 Plançon : Branche taillée en biseau (tige en dormance) repiquée en terre pour qu'elle prenne racine (utilisée comme bouture).

.2 Période de dormance : Période de repos végétatif durant laquelle les végétaux se mettent au repos, ralentissent leurs fonctions vitales et stoppent toute croissance afin d'économiser de l'énergie. La période de repos végétatif débute traditionnellement de la fin octobre à la fin mars dans la région de Québec.

1.5 RÉFÉRENCES

.1 Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) :

.1 Zones de rusticité pour les plantes au Canada (version la plus récente).

.2 Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC)/Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes (ACPP) :

.1 Norme canadienne du paysage, 2020, deuxième édition ;

.2 Norme canadienne sur les produits de pépinière, 2017, neuvième édition.

.3 Ministère de la Justice Canada (Jus) :

.1 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), 1999, ch. 33.

.4 Bureau de normalisation du Québec :

.1 BNQ 0605-100/2019 Aménagement paysager à l'aide de végétaux ;

.2 BNQ 0605-200 - Entretien paysager à l'aide de végétaux ;

.3 BNQ0419 – 070 - Amendements minéraux – Pierre à chaux naturelle.

.5 Norme nationale du Canada :

.1 CAN/BNQ 0413–200 - Amendements organiques – Composts.

1.6 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

.1 Soumettre les journaux de suivi et d'entretien qui documentent les informations, y compris, mais sans s'y limiter, l'identification des travaux d'entretien effectués, les observations sur l'état et la croissance des plants et plançons incluant l'état des ouvrages de stabilisation (déplacement des pierres, érosion du matériel de remplissage, etc.). Aviser rapidement le Consultant de toutes les mesures

préventives et correctives requises à l'extérieur des responsabilités de l'Entrepreneur.

.2 Soumettre des copies lisibles et signées des données du journal d'entretien au Consultant avec chaque demande de paiement.

.3 Le Consultant peut prolonger la période de garantie sans frais supplémentaires pour la Ville ou réduire les paiements si les situations suivantes se produisent :

.1 L'Entrepreneur omet de conserver ou de soumettre un journal d'entretien précis ;

.2 Un entretien inadéquat du site se produit ;

.3 Lorsque des travaux d'entretien insatisfaisants sont effectués ;

.4 L'Entrepreneur doit utiliser le modèle de journal de suivi et d'entretien fourni.

1.7 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

.1 Qualifications :

.1 Le personnel affecté aux travaux d'arrosage, d'entretien et de suivi doit avoir une expérience pertinente pour le suivi et l'entretien d'ouvrages de génie végétal ;

.2 Fournir des preuves de qualification à la demande du Consultant.

1.8 MODALITÉS ADMINISTRATIVES

.1 Soumettre le calendrier des travaux au Consultant, aux fins d'examen, dix (10) jours avant le début des travaux d'arrosage, d'entretien et de suivi :

.1 Le calendrier des travaux doit indiquer les renseignements suivants ;

.1 Les dates prévues des travaux d'arrosage ;

.2 Les dates prévues des travaux suivi et d'entretien complet ;

.3 Dates de remplacement des végétaux (si requis).

.2 Aviser le Propriétaire et le Consultant, 24 heures avant la visite de l'heure prévue de la visite d'entretien.

2 PRODUIT

2.1 EAU POUR L'ARROSAGE

.1 L'Entrepreneur doit fournir de l'eau pour l'irrigation qui est propre, exempte de contaminants et avec une turbidité égale ou inférieure aux lectures de fond dans le plan d'eau. L'eau potable utilisée pour l'arrosage des végétaux doit être déchlorée conformément aux normes et règlements de protection de l'environnement.

3 EXÉCUTION

3.1 GÉNÉRALITÉS

.1 Assurer l'entretien et le suivi des végétaux pendant la période de garantie de 2 ans selon la présente section et selon les sections 35 31 19.1 à 19.3 : articles portant sur la garantie des plançons et la garantie des végétaux en contenant.

3.2 ARROSAGE ET ENTRETIEN

.1 Arroser les plants et plançons pour assurer leur établissement racinaire et leur croissance à l'intérieur des ouvrages végétalisés pendant les deux (2) premières saisons de croissance pour une période de 6 mois (mai à octobre) selon le calendrier suivant :

.1 Une à deux (1-2) fois par semaine en mai/septembre/octobre ;

.2 Deux à trois (2-3) fois par semaine en juin/juillet/août.

.2 Un arrosage supplémentaire doit être complété jusqu'à un maximum de trois (3) fois par semaine, si les températures quotidiennes sont supérieures à 30 °C.

.3 Arroser les plants et plançons selon le calendrier ci-dessus à moins que 25 mm de précipitations (pluie) ou plus aient été enregistrées près du site du projet au cours des 7 jours précédents. Arroser entre 6h00 et 9h00 et/ou 19h00 et 23h00, sauf indication contraire du Consultant.

.4 Arroser les plants et plançons pour leur croissance à l'intérieur des ouvrages végétalisés pendant la troisième saison croissance et les années suivantes pour une période de 3 mois (juin à août), après entente avec le Consultant et le Propriétaire, selon calendrier suivant :

.1 Une à deux (1-2) fois par semaine en juin/juillet/août.

.5 Procéder à trois (3) visites de suivi et d'entretien complet chaque saison de croissance pendant les deux (2) premières années, soit une visite au printemps, une visite à l'été et une visite à l'automne.

.6 Procéder à trois (3) visites de suivi et d'entretien complet chaque saison de croissance pendant la troisième saison croissance et les années suivantes, soit une visite au printemps et une visite à l'automne, suite à une entente avec le Consultant et le Propriétaire.

.7 Contrôler les mauvaises herbes pour favoriser l'établissement de la végétation plantée au moins trois fois par saison de croissance, c'est-à-dire au printemps, en été et en automne.

.8 Contrôler toutes les espèces végétales exotiques envahissantes conformément à l'article 3.1 de la section 01 35 43 Protection de l'environnement durant la période de garantie. Utiliser des méthodes de désherbage mécanique ou manuel ; l'utilisation d'herbicides chimiques n'est pas autorisée. Les espèces végétales exotiques envahissantes comprennent, mais sans s'y limiter :

.1 Alpiste faux-roseau – Phalaris arundinacea ;

.2 Érable à Giguère – Acer negundo ;

.3 Renouée du Japon – Fallopia japonnica ;

.4 Salicaire pourpre - Lythrum salicaria.

.9 Contrôler toutes les espèces végétales exotiques envahissantes conformément à l'article 3.1 de la section 01 35 43 Protection de l'environnement durant la troisième année et les années suivantes, conformément à l'article 3.1 de la section 01 35 43 Protection de l'environnement. Utiliser des méthodes de désherbage mécanique ou manuel ; l'utilisation d'herbicides chimiques n'est pas autorisée.

.10 Durant la période de garantie de deux ans, les plants et plançons dépérissants ou morts identifiés par le Consultant doivent être enlevés et remplacés à la fin de chaque saison de croissance, sans frais pour le Propriétaire. Lorsqu'un plant ou plançon ne peut pas être enlevé, planter un plançon de remplacement ou un petit arbuste en contenant selon les directives du Consultant. Le remplacement des végétaux doit être fait conformément aux articles 2.5.6.5 et 2.6.4.5 des sections 35 31 19.1 à 19.3 et en respectant les patrons et tableaux de plantation prévus pour les ouvrages végétalisés. Tout changement au plan doit être approuvé par le Consultant.

.11 Préparer et soumettre les journaux de suivi et d'entretien comme spécifier et selon la grille de suivi proposée incluse en annexe du présent devis des clauses techniques particulières.

.12 Le Consultant et le représentant de la Ville se réservent le droit d'annuler les travaux d'entretien à tout moment. Un préavis d'un mois sera fourni à l'Entrepreneur.

3.3 MODALITÉS D'ARROSAGE

.1 Effectuer par mouillage de la surface du terreau.

.2 Utilisation interdite de système d'injection ou d'arrosage sous pression en profondeur.

.3 Arroser avec un débit approprié et non excessif pour que le terreau détrempé par mouillage soit celui des ouvrages de stabilisation végétale et des trous de plantation des végétaux en multicellule. Arrêter l'arrosage et procéder en séquence si la quantité d'eau prescrite amène le ruissellement hors des lits de plantation ou des cuvettes d'arrosage.

FIN DE SECTION

Annexe B

Fiches individuelles des végétaux

ANNEXE B | LEXIQUE DES CODES

QUALITÉ DU BOIS		
Options	**Description | définition**	**Code**
Haute		1
Moyenne		2
Faible		3
Très faible		4
ÉTAT DE SANTÉ		
Options	**Description | définition**	**Code**
Sain		0
Faiblement affecté		1
Modérément affecté		2
Mourant		3
Mort (debout)		4
CAUSE DES DOMMAGES		
Options	**Description | définition**	**Code**
Aucun		0
Insectes		1
Maladies		2
Tiges cassées		3
Feux		4
Tronc annelé		5
Tronc creux		6
Dégâts dû aux animaux		7
Dégâts dû à l'activité humaine		8
Autre		99

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Aucunes reprises	S.O.

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+074,4 @ 0+090,4



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : S.O.
Hauteur de tige : S.O
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : S.O.
État de santé : S.O.
Cause de dommages : 99 - Aucunes reprises

ARTELIA


ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Salix interior	Saule intérieur

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+100

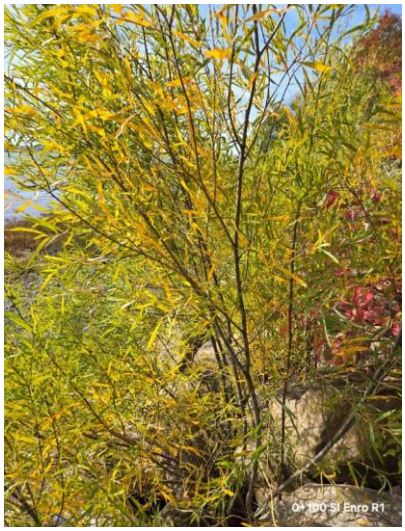

OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 230 cm
Hauteur de tige : 290 cm
Nombre de tiges : 4

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0


ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Cornus stolonifera	Cornouiller stolonifère

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+100

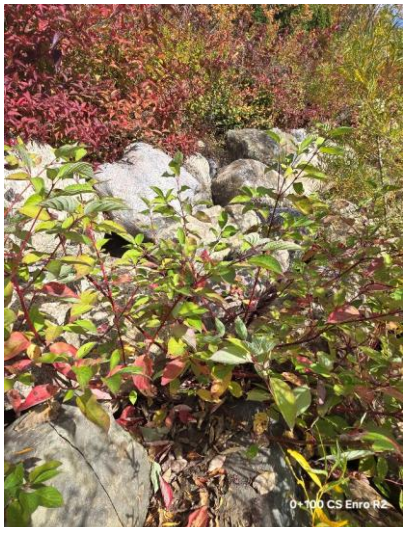

OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 175 cm
Hauteur de tige : 175 cm
Nombre de tiges : 3

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Spiraea alba latifolia	Spirée à larges feuilles

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+100



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 90 cm
Hauteur de tige : 110 cm
Nombre de tiges : 4

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Diervilla lonicera	Dièreville chèvrefeuille

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+100



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO DU PIED	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 140 cm
Hauteur de tige : 130 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Amelanchier stolonifera	Amélanchier stolonifère

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+100



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 65 cm
Hauteur de tige : 85 cm
Nombre de tiges : 1

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Salix eriocephala	Saule à tête laineuse

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+140



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO DU PIED (6 cm)	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 300 cm
Hauteur de tige : 280 cm
Nombre de tiges : 5

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Cornus stolonifera	Cornouiller stolonifère

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+140



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 110 cm
Hauteur de tige : 180 cm
Nombre de tiges : 4

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Diervilla lonicera	Dièreville chèvrefeuille

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+140



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 125 cm
Hauteur de tige : 92 cm
Nombre de tiges : 20

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Spiraea alba latifolia	Spirée à larges feuilles

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+140



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 85 cm
Hauteur de tige : 100 cm
Nombre de tiges : 22

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Cornus stolonifera	Cornouiller stolonifère

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+140



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 170 cm
Hauteur de tige : 125 cm
Nombre de tiges : 11

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0


ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Salix interior	Saule intérieur

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+180

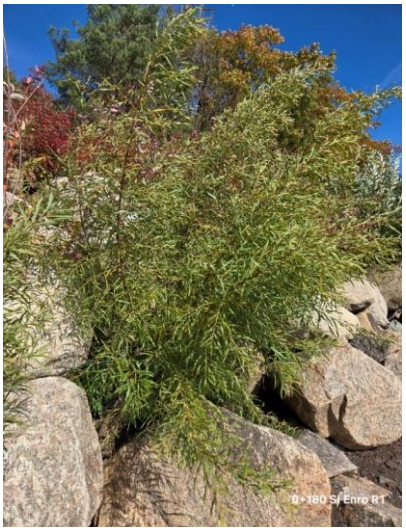

OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO DU PIED	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 160 cm
Hauteur de tige : 250 cm
Nombre de tiges : 1

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Cornus stolonifer	Cornouiller stolonifère

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+180



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 150 cm
Hauteur de tige : 170 cm
Nombre de tiges : 10

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Physocarpus opulifolius	Physocarpe à feuilles d'obier

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+180



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 50 cm
Hauteur de tige : 140 cm
Nombre de tiges : 1

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Rosa blanda	Rosier inerme

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+180



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 70 cm
Hauteur de tige : 114 cm
Nombre de tiges : 6

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Diervilla lonicera	Dierville chèvrefeuille

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+180



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 90 cm
Hauteur de tige : 85 cm
Nombre de tiges : 22

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Spiraea alba latifolia	Spirée à larges feuilles

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+180



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 45 cm
Hauteur de tige : 130 cm
Nombre de tiges : 5

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0


ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Salix interior	Saule intérieur

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+240

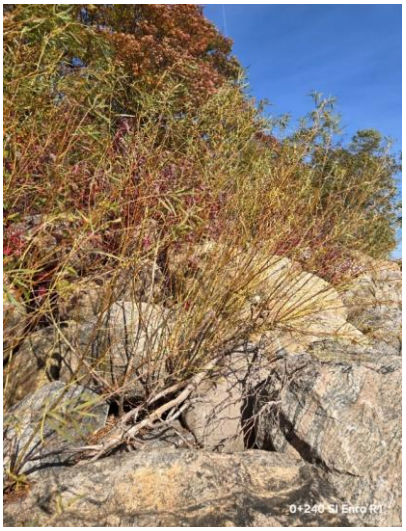

OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO DE PIED	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 210 cm
Hauteur de tige : 270 cm
Nombre de tiges : 4

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Diervilla lonicera	Dierville chèvrefeuille

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+240



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 80 cm
Hauteur de tige : 105 cm
Nombre de tiges : 1

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Cornus stolonifera	Cornouiller stolonifère

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+240



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 120 cm
Hauteur de tige : 150 cm
Nombre de tiges : 1

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Spiraea alba latifolia	Spirée à larges feuilles

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+240



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 80 cm
Hauteur de tige : 120 cm
Nombre de tiges : 18

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Rosa blanda	Rosier inerme

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+240



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 10 cm
Hauteur de tige : 60 cm
Nombre de tiges : 1

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Diervilla lonicera	Dierville chèvrefeuille

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+240



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 80 cm
Hauteur de tige : 125 cm
Nombre de tiges : 5

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Salix interior	Saule intérieur

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+300



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 50 cm
Hauteur de tige : 80 cm
Nombre de tiges : 1

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0


ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Physocarpus opulifolius	Physocarpe à feuilles d'obier

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+300

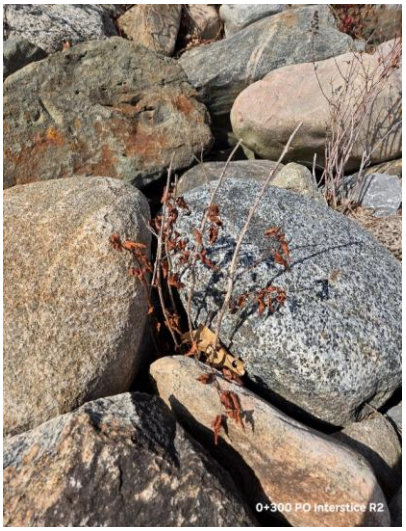

OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 27 cm
Hauteur de tige : 60 cm
Nombre de tiges : 1

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0


ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Spiraea alba latifolia	Spirée à larges feuilles

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+300

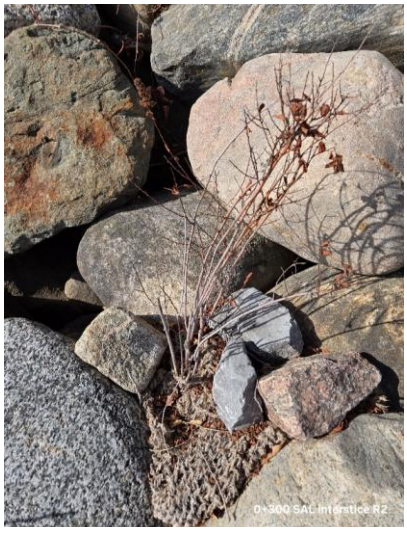

OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 30 cm
Hauteur de tige : 70 cm
Nombre de tiges : 1

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Vitis riparia	Vignes des rivages / Spontané

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+300



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO DU FEUILLAGE	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 10 cm
Hauteur de tige : 165 cm
Nombre de tiges : 1

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0


ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Physocarpus opulifolius	Physocarpe à feuilles d'obier

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+300

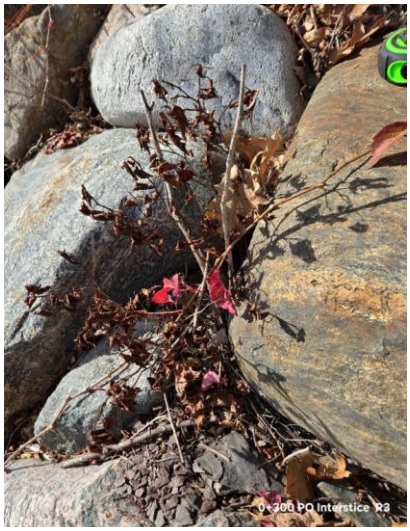

OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 30 cm
Hauteur de tige : 40 cm
Nombre de tiges : 1

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Spiraea alba latifolia	Spirée à larges feuilles

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+400



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO DU FEUILLAGE	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 24 cm
Hauteur de tige : 64 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Salix interior	Saule intérieur

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+400



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 70 cm
Hauteur de tige : 130 cm
Nombre de tiges : 1

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Cornus stolonifera	Cornouiller stolonifère

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+400



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 54 cm
Hauteur de tige : 86 cm
Nombre de tiges : 1

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Physocarpus opulifolius	Physocarpe à feuilles d'obier

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+400



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 85 cm
Hauteur de tige : 145 cm
Nombre de tiges : 1

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0


ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Spiraea alba latifolia	Spirée à larges feuilles

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+400

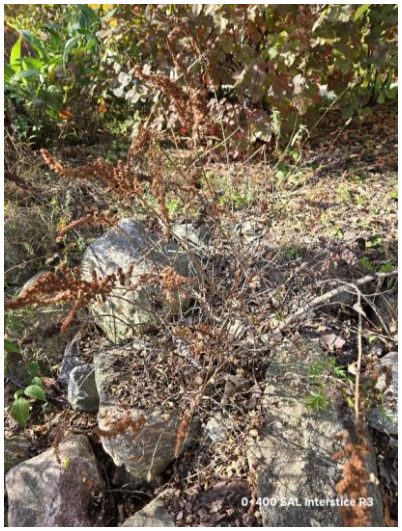

OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 60 cm
Hauteur de tige : 68 cm
Nombre de tiges : 1

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Aucun végétal	S.O.

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+500

S.O.
AUCUN VÉGÉTAL

OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : S.O.
Hauteur de tige : S.O.
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : S.O.
État de santé : S.O.
Cause de dommages : S.O.

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Spiraea alba latifolia	Spirée à larges feuilles

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+500



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 28 cm
Hauteur de tige : 50 cm
Nombre de tiges : 1

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Spiraea alba latifolia	Spirée à larges feuilles

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+500



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 80 cm
Hauteur de tige : 110 cm
Nombre de tiges : 18

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Physocarpus opulifolius	Physocarpe à feuilles d'obier

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+500



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 90 cm
Hauteur de tige : 90 cm
Nombre de tiges : 8

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Salix lucida	Saule brillant

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+550



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO DES MULTITIGES	PHOTO DU FEUILLAGE	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 290 cm
Hauteur de tige : 270 cm
Nombre de tiges : 5

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Cornus stolonifera	Cornouiller stolonifère

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+550



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 120 cm
Hauteur de tige : 215 cm
Nombre de tiges : 2

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Cornus stolonifera	Cornouiller stolonifère

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+550



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 160 cm
Hauteur de tige : 110 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Spiraea alba latifolia	Spirée à larges feuilles

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 0+550



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 30 cm
Hauteur de tige : 30 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Cornus stolonifera	Cornouiller stolonifère

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+010 (localisation approximative)



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 58 cm
Hauteur de tige : 90 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Aucun végétal	S.O.

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+010 (localisation approximative)

S.O.
AUCUN VÉGÉTAL

OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : S.O.
Hauteur de tige : S.O.
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : S.O.
État de santé : S.O.
Cause de dommages : S.O.

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Spiraea alba latifolia	Spirée à larges feuilles

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+010 (localisation approximative)



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O.
Rayon du couvert / couvert arborescent : 46 cm
Hauteur de tige : 63 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Salix interior	Saule intérieur

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+055 (localisation approximative)



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DE ZONE D'ÉROSION	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 70 cm
Hauteur de tige : 180 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Cornus stolonifera	Cornouiller stolonifère

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+055 (localisation approximative)



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 90 cm
Hauteur de tige : 77 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Spiraea alba latifolia	Spirée à larges feuilles

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+055 (localisation approximative)



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 20 cm
Hauteur de tige : 60 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Phragmite australis subsp. australis	Roseau commun

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+060 (localisation approximative)



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU VÉGÉTAL	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : S.O
Hauteur de tige : S.O
Nombre de tiges : S.O

Qualité du bois : S.O.
État de santé : S.O.
Cause de dommages : S.O.

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Colonisation arbustive de la berge	

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+070 (localisation approximative)



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : S.O
Hauteur de tige : S.O
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : S.O.
État de santé : S.O.
Cause de dommages : S.O.

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Cornus stolonifera	Cornouiller stolonifère

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+075 (localisation approximative)



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 67 cm
Hauteur de tige : 107 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Cornus stolonifera	Cornouiller stolonifère

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+075 (localisation approximative)



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 90 cm
Hauteur de tige : 95 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Cornus stolonifera	Cornouiller stolonifère

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+227,5



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 60 cm
Hauteur de tige : 75 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Salix interior	Saule intérieur

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+227,5



OBSERVATIONS VISUELLES



PHOTO DU PLANT DE LA RENOUÉE DU JAPON



PHOTO DU PLANT DE LA RENOUÉE DU JAPON



PHOTO DU PLANT DE LA RENOUÉE DU JAPON

PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 30 cm
Hauteur de tige : 150 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 99

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Salix eriocephala	Saule à tête laineuse

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+227,5



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 30 cm
Hauteur de tige : 170 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0


ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Salix interior	Saule intérieur

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+287,5

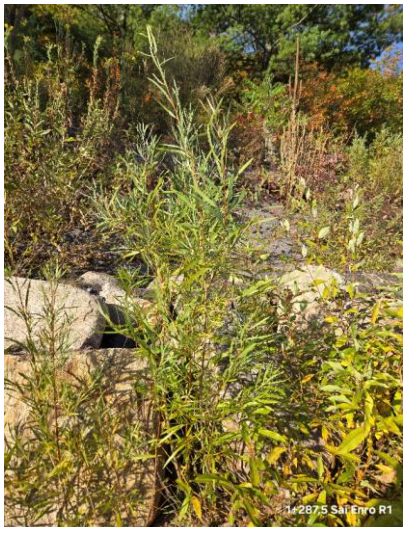

OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DES MULTI-TIGES	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 60 cm
Hauteur de tige : 175 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0


ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Salix eriocephala	Saule à tête laineuse

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+287,5

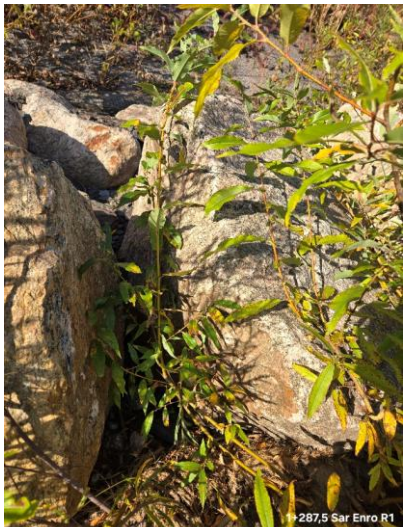

OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DES MULTI-TIGES	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 15 cm
Hauteur de tige : 110 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Salix interior	Saule intérieur

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+287,5



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DES MULTI-TIGES	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 25 cm
Hauteur de tige : 144 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Salix eriocephala	Saule à tête laineuse

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+287,5



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DES MULTI-TIGES	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 45 cm
Hauteur de tige : 173 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Cornus stolonifera	Cornouiller stolonifère

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+287,5



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DES MULTI-TIGES	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 80 cm
Hauteur de tige : 88 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Cornus stolonifera	Cornouiller stolonifère

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+287,5



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU VÉGÉTAL	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 83 cm
Hauteur de tige : 55 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Cornus stolonifera	Cornouiller stolonifère

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+690



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 100 cm
Hauteur de tige : 120 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0


ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Salix eriocephala	Saule à tête laineuse

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+690

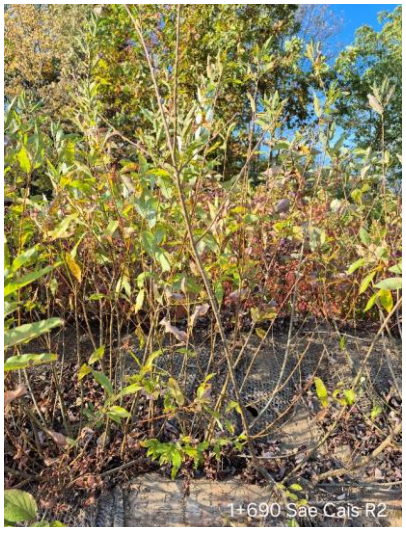

OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 130 cm
Hauteur de tige : 170 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Cornus stolonifera	Cornouiller stolonifère

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+690



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 90 cm
Hauteur de tige : 100 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0


ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Spiraea alba latifolia	Spirée à larges feuilles

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+780

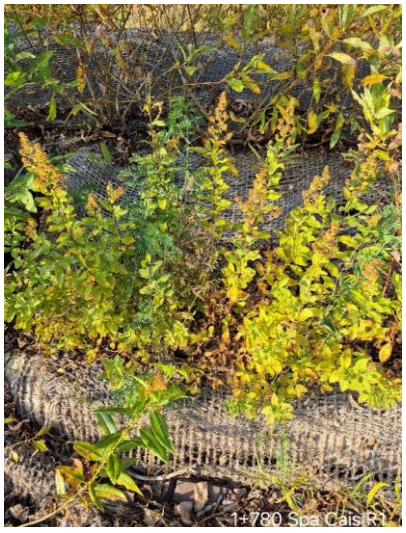

OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 47 cm
Hauteur de tige : 72 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0


ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Salix interior	Saule intérieur

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+780

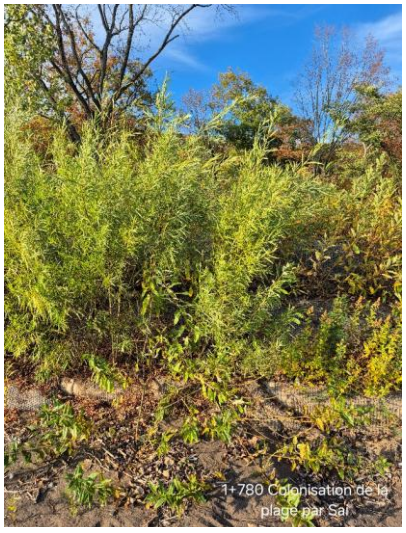

OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : S.O
Hauteur de tige : S.O
Nombre de tiges : S.O

Qualité du bois : S.O.
État de santé : S.O.
Cause de dommages : S.O.


ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Salix eriocephala	Saule à tête laineuse

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+780

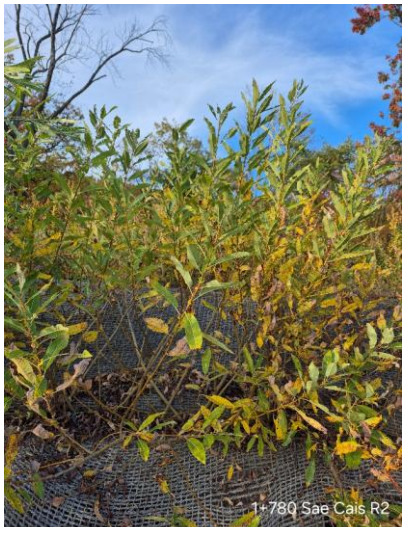

OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : 00 mm
Rayon du couvert / couvert arborescent : 130 cm
Hauteur de tige : 120 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0


ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Spiraea alba latifolia	Spirée à larges feuilles

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+780

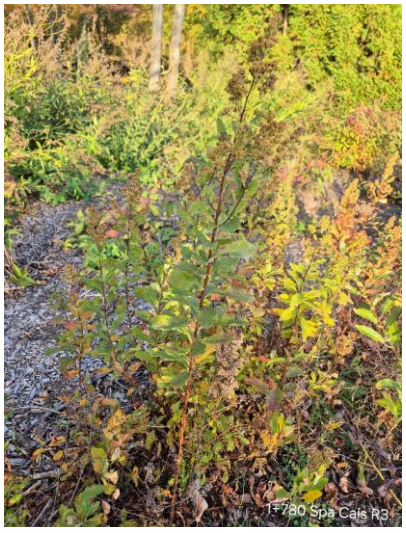

OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 44 cm
Hauteur de tige : 83 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Cornus stolonifera	Cornouiller stolonifère

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+840



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO DU VÉGÉTAL	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 80 cm
Hauteur de tige : 100 cm
Nombre de tiges : 49

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Cornus stolonifera	Cornouiller stolonifère

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+840



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 100 cm
Hauteur de tige : 120 cm
Nombre de tiges : 68

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Spiraea alba latifolia	Spirée à larges feuilles

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+840



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 55 cm
Hauteur de tige : 85 cm
Nombre de tiges : 67

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Cornus stolonifera	Cornouiller stolonifère

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+900



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 80 cm
Hauteur de tige : 100 cm
Nombre de tiges : 38

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Cornus stolonifera	Cornouiller stolonifère

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+900



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 120 cm
Hauteur de tige : 110 cm
Nombre de tiges : 65

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Spiraea alba latifolia	Spirée à larges feuilles

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+900



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 85 cm
Hauteur de tige : 88 cm
Nombre de tiges : 52

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Salix interior	Saule intérieur

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+940



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 85 cm
Hauteur de tige : 200 cm
Nombre de tiges : 34

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Salix interior	Saule intérieur

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+940



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 85 cm
Hauteur de tige : 170 cm
Nombre de tiges : 16

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Cornus stolonifera	Cornouiller stolonifère

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+940



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 90 cm
Hauteur de tige : 70 cm
Nombre de tiges : 47

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0


ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Salix interior	Saule intérieur

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+990

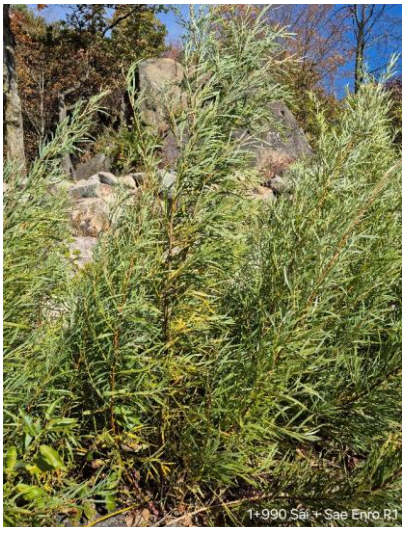

OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 120 cm
Hauteur de tige : 210 cm
Nombre de tiges : 39

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ARTELIA


ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Salix eriocephala	Saule à tête laineuse

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+990

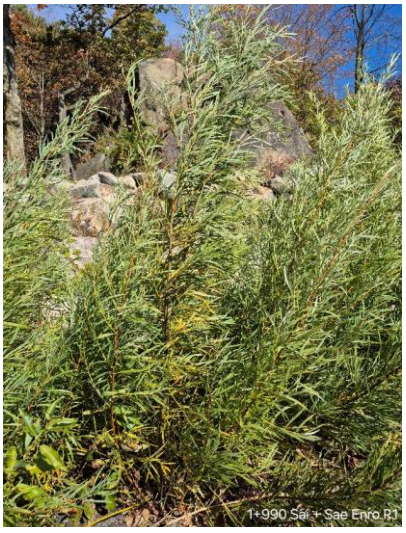

OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 75 cm
Hauteur de tige : 135 cm
Nombre de tiges : 10

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Physocarpus opulifolius	Physocarpe à feuilles d'obier

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+990



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 60 cm
Hauteur de tige : 120 cm
Nombre de tiges : 7

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Cornus stolonifera	Cornouiller stolonifère

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+990



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 70 cm
Hauteur de tige : 82 cm
Nombre de tiges : 8

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0


ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Spiraea alba latifolia	Spirée à larges feuilles

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+990

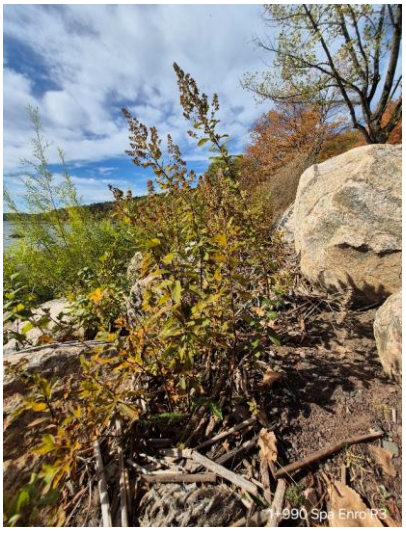

OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 40 cm
Hauteur de tige : 70 cm
Nombre de tiges : 14

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Spiraea alba latifolia	Spirée à larges feuilles

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+990



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 30 cm
Hauteur de tige : 75 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0


ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Rosa blanda	Rosier inerme

Localisation : ☐ PARC | ☒ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude (S.O.) | Longitude (S.O.)
Coordonnées du transect :
Chainage 1+990

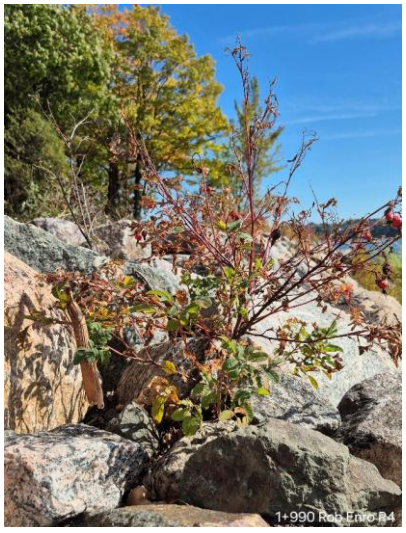

OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO DU TRANSECT	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : S.O
Rayon du couvert / couvert arborescent : 70 cm
Hauteur de tige : 60 cm
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7470161639196 | Longitude -71,3356532034924

Coordonnées du transect :

S.O.

Visuel non disponible

OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 46 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 175 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Quercus rubra	Chêne rouge

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7470432422529 | Longitude -71,3355689010841

Coordonnées du transect :

S.O.

Visuel non disponible

OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 41 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 80 cm

Hauteur de tige : S.O

Nombre de tiges : S.O

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7470624562529 | Longitude -71,3356026782924

Coordonnées du transect :

S.O.

Visuel non disponible

OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 39 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 120 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7470796490445 | Longitude -71,3355669658757

Coordonnées du transect :

S.O.

Visuel non disponible

OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 38 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 76 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7470599622945 | Longitude -71,3355365546674

Coordonnées du transect :

S.O.

Visuel non disponible

OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 45 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 74 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Thuya occidentalis	Thuja occidental

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7471115160584 | Longitude -71,335444647034

Coordonnées du transect :

S.O.

Visuel non disponible

OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 30 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 62 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7471384496362 | Longitude -71,3353213388174

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 74 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 150 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7471988072445 | Longitude -71.335035377884

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 36 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 62 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7472041354612 | Longitude -71,3350147735007

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 39 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 78 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Acer	Érable

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7472157602029 | Longitude -71,3349587628923

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 51 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 127 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Acer	Érable

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7472174527529 | Longitude -71,334903513334

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 43 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 112 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Thuya occidentalis	Thuja occidental

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7472387395445 | Longitude -71,3348468862507

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 18 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 74 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Thuya occidentalis	Thuja occidental

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7472313202612 | Longitude -71,3348153947507

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 30 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 76 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Acer	Érable

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7472481885445 | Longitude -71,3346284825424

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 69 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 140 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Acer	Érable

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7472589495862 | Longitude -71,334569531584

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 60 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 214 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Acer	Érable

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7472686725028 | Longitude -71,3345190460007

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 78 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 200 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Pinus strobus	Pin blanc

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7472958911279 | Longitude -71,334343385584

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 54 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 118 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7473038407529 | Longitude -71,334270152834

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 18 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 51 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7473281087112 | Longitude -71,334230954709

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 74mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 243 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7473576075862 | Longitude -71,3342128900007

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 35 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 77 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Quercus rubra	Chêne rouge

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude 46,7473613799612 | Longitude -71,334168372209
S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : 26 mm
Rayon du couvert / couvert arborescent : 74 cm
Hauteur de tige : S.O.
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Acer	Érable

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7473711099612 | Longitude -71,3341099142924

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 81 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 215 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7473811150029 | Longitude -71,3340557288757

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 54 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 170 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7473929248029 | Longitude -71,333987837909

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 49 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 106 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7473575981695 | Longitude -71,3339564755424

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 58 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 117 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7474071279612 | Longitude -71,333918188459

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 43 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 57 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7474126338779 | Longitude -71,3338777980007

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 57 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 220 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7474322615862 | Longitude -71,3338844541257

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 53 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 154 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7474508221279 | Longitude -71,3338328122924

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 50 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 141 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Betula papyrifera	Bouleua à papier

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7474342199195 | Longitude -71,333806240709

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 39 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 137 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7474665244195 | Longitude -71,3337822071257

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 59 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 182 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7474567124612 | Longitude -71,3337320245424

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 57 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 145 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7472968437945 | Longitude -71,334090311959

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 27 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 128 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7475143110862 | Longitude -71,3328548079174

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 47 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 150 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7475950771695 | Longitude -71,332886991459

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 53 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 153 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Quercus rubra	Chêne rouge

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7475082204195 | Longitude -71,3326982293757

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 31 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 74 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Acer	Érable

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7474836949612 | Longitude -71,3324245986257

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 48 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 146 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Acer	Érable

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude 46,7475194302945 | Longitude -71,3322488120007
Coordonnées du transect :
S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : 58 mm
Rayon du couvert / couvert arborescent : 143 cm
Hauteur de tige : S.O.
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Acer	Érable

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7475295028362 | Longitude -71,3321597658757

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 45 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 86 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Quercus rubra	Chêne rouge

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7475578438779 | Longitude -71,3320457862507

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 29 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 62 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Acer	Érable

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7475865684612 | Longitude -71,331967723959

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 46 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 80 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Acer	Érable

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7476089932945 | Longitude -71,3318879006257

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 56 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 170 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Acer	Érable

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7476354353779 | Longitude -71,331830063459

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 54 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 138 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7476532482945 | Longitude -71,331774416209

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 67 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 200 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7478439962112 | Longitude -71,331365238

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 48 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 118 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7478820882112 | Longitude -71,3313219416257

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 44 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 136 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7479693023362 | Longitude -71,330889759209

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 65 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 170 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7479892798362 | Longitude -71,3308326626674

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 66 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 156 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Populus tremuloides	Peuplier faux-tremble

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7480926198362 | Longitude -71,3309552003757

Coordonnées du transect :

S.O.

Note : Présence roseau commun.



OBSERVATIONS VISUELLES



PHOTO 01



PHOTO 02

PHOTO 03

PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 53 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 195 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Populus tremuloides	Peuplier faux-tremble

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7481054002945 | Longitude -71,3308995183757

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 34 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 64 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Populus tremuloides	Peuplier faux-tremble

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7481170714612 | Longitude -71,3308310576674

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 39 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 97 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Quercus rubra	Chêne rouge

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7481228010445 | Longitude -71,330644583959

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 34 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 102 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7481552644195 | Longitude -71,330618616459

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 39 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 77 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7481397930445 | Longitude -71,330586919584

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 32 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 65 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Betula papyrifera	Bouleau à papier

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7481362620028 | Longitude -71,330516274459

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 30 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 95 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Betula papyrifera	Bouleau à papier

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7481610739612 | Longitude -71,3305122346674

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 29 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 126 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7481510651695 | Longitude -71,330463494709

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 45 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 117 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Pinus strobus	Pin blanc

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude 46,7481820641028 | Longitude -71,3304548069674
Coordonnées du transect :
S.O.
Note : Arbre existant



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : 69 mm
Rayon du couvert / couvert arborescent : 124 cm
Hauteur de tige : S.O.
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Quercus rubra	Chêne rouge

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7482139392528 | Longitude -71,330468938959

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 32 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 86 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Quercus rubra	Chêne rouge

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7482134246695 | Longitude -71,3304186471257

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 37 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 98 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Betula papyrifera	Bouleau à papier

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7481804815862 | Longitude -71,3303939012924

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 36 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 105 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Quercus rubra	Chêne rouge

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7482405926279 | Longitude -71,3303632346674

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 35 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 70 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Betula papyrifera	Bouleau à papier

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7481997736695 | Longitude -71,3303369975007

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 32 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 77 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Quercus rubra	Chêne rouge

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7482523832112 | Longitude -71,3303173579174

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 31 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 77 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7480933479612 | Longitude -71,3304435315007

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 71 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 147 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7481225723362 | Longitude -71,3302480799174

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 68 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 124 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7482484597112 | Longitude -71,330203398834

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 45 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 82 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Quercus rubra	Chêne rouge

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7482787599195 | Longitude -71,3301925539591

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 31 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 68 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Betula papyrifera	Bouleau à papier

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7482114746278 | Longitude -71,3301550982507

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 33 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 115 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7482301634862 | Longitude -71,330152214284

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 41 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 113 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Quercus rubra	Chêne rouge

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7482909042112 | Longitude -71,3301515411257

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 32 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 85 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Quercus rubra	Chêne rouge

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude 46,7483012288779 | Longitude -71,3300741703757
Coordonnées du transect :
S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : 31 mm
Rayon du couvert / couvert arborescent : 68 cm
Hauteur de tige : S.O.
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Quercus rubra	Chêne rouge

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude 46,7483049507528 | Longitude -71,3300076025007
Coordonnées du transect :
S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : 35 mm
Rayon du couvert / couvert arborescent : 66 cm
Hauteur de tige : S.O.
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Acer	Érable

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Coordonnées du transect :
Latitude 46,7483025114195 | Longitude -71,329948588334
Coordonnées du transect :
S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : 58 mm
Rayon du couvert / couvert arborescent : 113 cm
Hauteur de tige : S.O.
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Acer	Érable

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7483009801695 | Longitude -71,3298878133757

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 58 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 115 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Acer	Érable

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7482846828779 | Longitude -71,3298251698757

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 57 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 114 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Betula papyrifera	Bouleau à papier

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude 46,7482794127529 | Longitude -71,3297926170424
Coordonnées du transect :
S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : 60 mm
Rayon du couvert / couvert arborescent : 137 cm
Hauteur de tige : S.O.
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Betula papyrifera	Bouleau à papier

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude 46,7483062331695 | Longitude -71,3297477166674
Coordonnées du transect :
S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : 29 mm
Rayon du couvert / couvert arborescent : 140 cm
Hauteur de tige : S.O.
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Acer	Érable

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7482689686695 | Longitude -71,3298703598757

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 53 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 122 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Acer	Érable

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude 46,7482696548778 | Longitude -71,3299505596674
Coordonnées du transect :
S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : 61 mm
Rayon du couvert / couvert arborescent : 145 cm
Hauteur de tige : S.O.
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Pinus srobus	Pin blanc

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7482750812112 | Longitude -71,3300005427507

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 45 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 94 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Pinus strobus	Pin blanc

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7482518169612 | Longitude -71,3300217997924

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 49 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 81 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Pinus strobus	Pin blanc

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7482542327529 | Longitude -71,3300601815424

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 53 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 85 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Pinus strobus	Pin blanc

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7482594804195 | Longitude -71,330123614084

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 59 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 67 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Betula papyrifera	Bouleau à papier

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7482274164612 | Longitude -71,330115545209

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 39 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 116 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Betula papyrifera	Bouleau à papier

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7482390357945 | Longitude -71,3301522431257

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 42 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 115 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Pinus strobus	Pin blanc

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude 46,7482011609612 | Longitude -71,3297936842924
Coordonnées du transect :
S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : 66 mm
Rayon du couvert / couvert arborescent : 115 cm
Hauteur de tige : S.O.
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Pinus strobus	Pin blanc

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7483147929195 | Longitude -71,3296628145007

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 62 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 98 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7483204055445 | Longitude -71,3295910081257

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 47 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 74 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7483308563362 | Longitude -71,3295167462924

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 47 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 83 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7483463666695 | Longitude -71,3294333548757

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 43 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 58 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Populus tremuloides	Peuplier faux-tremble

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7482348182945 | Longitude -71,3296522333757

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 51 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 69 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Populus tremuloides	Peuplier faux-tremble

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7482375252862 | Longitude -71,3296007165841

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 54 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 42 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7482482641528 | Longitude -71,3295475937757

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 43 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 96 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7482698517112 | Longitude -71,329504167459

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 44 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 115 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Populus tremuloides	Peuplier faux-tremble

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7482648446279 | Longitude -71,3294552187924

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 56 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 177 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Populus tremuloides	Peuplier faux-tremble

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7482805997945 | Longitude -71,329391978959

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 58 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 128 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Populus tremuloides	Peuplier faux-tremble

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7482859420029 | Longitude -71,3293374116257

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 38 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 153 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7483521442112 | Longitude -71,3289516312507

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 75 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 133 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7484703570862 | Longitude -71,3289700921257

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 52 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 233 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7484385699195 | Longitude -71,3289267497924

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 52 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 80 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7484441803862 | Longitude -71,3288893034506

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 45 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 112 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale


Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7484805832112 | Longitude -71,3288886386257

Coordonnées du transect :

S.O.

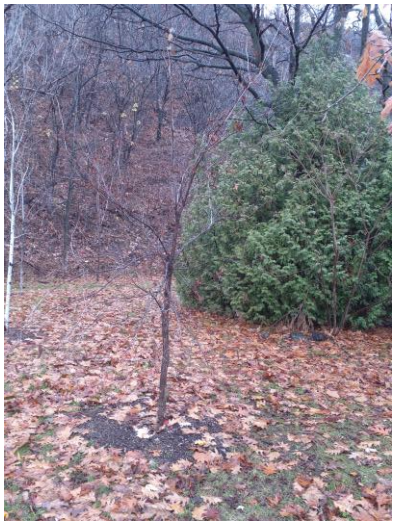

OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 45 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 162 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7484788746695 | Longitude -71,3289181970007

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 48 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 150 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7484996015445 | Longitude -71,328914795834

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 44 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 89 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Populus tremuloides	Peuplier faux-tremble

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7485353867112 | Longitude -71,3289424864173

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 47 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 100 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7486405256695 | Longitude -71,3288419231257

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 31 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 75 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Acer	Érable

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7486237107528 | Longitude -71,3288943947924

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 47 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 138 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale


Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7486041595445 | Longitude -71,328937757459

Coordonnées du transect :

S.O.

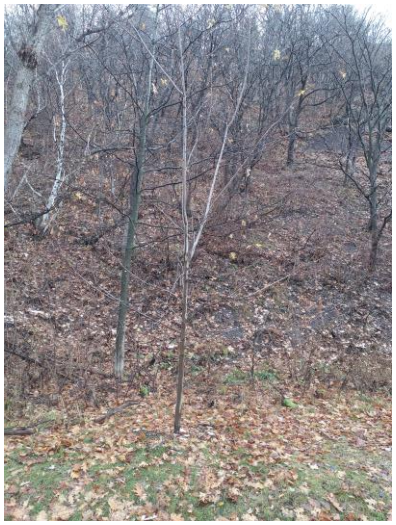

OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 67 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 166 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7485870081695 | Longitude -71,328984405334

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 44 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 112 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale


Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7485530246278 | Longitude -71,3290666791674

Coordonnées du transect :

S.O.

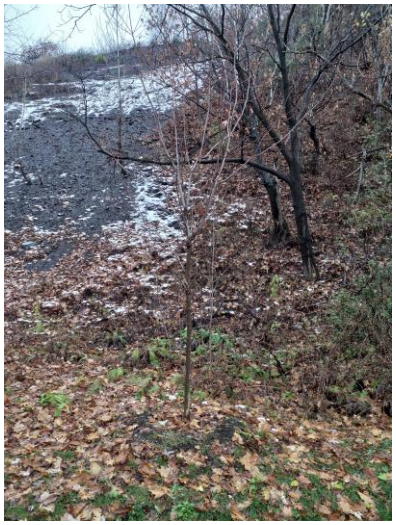

OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 50 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 135 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Acer	Érable

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7485063250445 | Longitude -71,3290844405007

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 67 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 128 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7486496867945 | Longitude -71,3276195510424

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 14 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 43 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7486500262945 | Longitude -71,3275381967507

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 13 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 45 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7487063171695 | Longitude -71,327560035459

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 12 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 33 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7486646849195 | Longitude -71,3274501758757

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 20 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 40 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7486580749112 | Longitude -71,327346538109

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 12 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 55 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7486973790445 | Longitude -71,3272474196674

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 19 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 37 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7487134298362 | Longitude -71,3271704718757

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 9 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 31 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7487604256279 | Longitude -71,3271273650424

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 10 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 27 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7488543216279 | Longitude -71,3269914616674

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 11 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 42 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7488006530445 | Longitude -71,3269105355007

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 10 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 22 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Pinus strobus (relocalisé)	Pin blanc

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7488570742945 | Longitude -71,3269052505424

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 61 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 104 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Pinus strobus (relocalisé)	Pin blanc

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude 46,7488396604195 | Longitude -71,326875257959
Coordonnées du transect :
S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : 56 mm
Rayon du couvert / couvert arborescent : 70 cm
Hauteur de tige : S.O.
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Pinus strobus (relocalisé)	Pin blanc

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE
Coordonnées du point d'inventaire :
Latitude 46,7488490527945 | Longitude -71,3268380106257
Coordonnées du transect :
S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques
DHP : 59 mm
Rayon du couvert / couvert arborescent : 56 cm
Hauteur de tige : S.O.
Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1
État de santé : 0
Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7485938649195 | Longitude -71,327641520709

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 8 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 36 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7485886984195 | Longitude -71,3275409931257

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 10 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 37 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7486397539195 | Longitude -71,3271497209174

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 13 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 43 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7487129350862 | Longitude -71,3269962266674

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 18 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 27 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7487565476279 | Longitude -71,3268680902924

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 13 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 69 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7488321632529 | Longitude -71,326709657209

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 13 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 28 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7488760824612 | Longitude -71,326613503709

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 38 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 99 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1, blessure au tronc

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARTELIA

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Quercus rubra	Chêne rouge

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7490243472945 | Longitude -71,3265098454174

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 16 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 30 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7489463604445 | Longitude -71,3265225093757

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 19 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 88 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7489777437195 | Longitude -71,3264789773257

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 28 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 97 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7490118371695 | Longitude -71,3264110581257

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 14 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 35 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Acer	Érable

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7490689479612 | Longitude -71,323964751459

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES



PHOTO 01



PHOTO 02

PHOTO 03

PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 31 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 123 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Betula papyrifera	Bouleau à papier

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7490743396279 | Longitude -71,3236086337507

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 41 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 96 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7490600782945 | Longitude -71,3234772961257

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 42 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 97 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Acer	Érable

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7490646246279 | Longitude -71,3234301421674

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES



PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 39 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 114 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7490260101279 | Longitude -71,3234560276674

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 13 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 30 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7490050203112 | Longitude -71,323416883109

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 11 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 46 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Betula papyrifera	Bouleau à papier

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7490339024862 | Longitude -71,3233868733007

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 34 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 52 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7490644663779 | Longitude -71,323370116959

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 37 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 55 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7490050687528 | Longitude -71,3233600560424

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 11 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 46 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Quercus rubra	Chêne rouge

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7490749104195 | Longitude -71,3232990837924

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 30 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 42 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7490449435862 | Longitude -71,323269657334

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 37 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 45 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7490052539612 | Longitude -71,3232593483757

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 41 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 120 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7490708022528 | Longitude -71,3231648125424

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 30 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 70 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale
Betula papyrifera	Bouleau à papier

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7490346657529 | Longitude -71,3231137296257

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 38 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 54 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7490666548362 | Longitude -71,323086250959

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 23 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 100 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces	
Nom scientifique	**Nom local ou commerciale**

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7491375791695 | Longitude -71,3230691380424

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 30 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 74 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7490327368778 | Longitude -71,322991913709

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

			
PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 10 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 47 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7491514607112 | Longitude -71,3227778595007

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 43 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 57 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

ARTELIA

ANNEXE B | FICHE D'IDENTIFICATION DES VÉGÉTAUX

ARBRES OU ARBUSTES MESURÉS

Espèces

Nom scientifique	Nom local ou commerciale

Localisation : ☒ PARC | ☐ BERGE

Coordonnées du point d'inventaire :

Latitude 46,7491848064278 | Longitude -71,322799725384

Coordonnées du transect :

S.O.



OBSERVATIONS VISUELLES

PHOTO 01	PHOTO 02	PHOTO 03	PHOTO 04

Caractéristiques

DHP : 36 mm

Rayon du couvert / couvert arborescent : 140 cm

Hauteur de tige : S.O.

Nombre de tiges : S.O.

Qualité du bois : 1

État de santé : 0

Cause de dommages : 0

Annexe C

Tableaux synthèses des mesures par espèces

Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère

2100845-014

Ville de Québec - Stabilisation Plage-Jacques-Cartier

Fiche : [Type de végétaux]-[identification de la phase]-[numéro du secteur]-[numéro séquentiel du point d'inventaire]-[numéro séquentiel de la rangée]

Type de végétaux : A pour arbre_SB pour arbuste en stabilisation_PB pour arbuste en parc_V pour vivace

								Données 2025		
Fiche	**Date**	**Phase**	**Tronçon**	**Chaînage**	**Rang**	**Nom du végétal**	**Code**	**Hauteur cm**	**Largeur cm**	**Nombre de tiges/m**
SB-01-01-001-R01	2025-10-10	1 Plage	**1**	**0+074,4 @ 0+090,4**	Enrochement Rang 1, 2 et 3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SB-01-01-002-R02	2025-10-10	1 Plage	**1**	**0+100**	Enrochement Rang 2	Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère	CS	175	175	3
SB-01-01-003-R02	2025-10-10	1 Plage	**1**	**0+140**	Enrochement Rang 2	Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère	CS	180	110	4
SB-01-01-003-R03	2025-10-10	1 Plage	**1**	**0+140**	Enrochement Rang 3	Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère	CS	125	170	11
SB-01-01-004-R02	2025-10-10	1 Plage	**1**	**0+180**	Enrochement Rang 2	Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère	CS	170	150	10
SB-01-01-005-R02	2025-10-10	1 Plage	**1**	**0+240**	Enrochement Rang 2	Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère	CS	150	120	1
SB-01-02-007-R02	2025-10-10	1 Plage	**2**	**0+400**	Interstice Rang 2	Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère	CS	86	54	1
SB-01-03-009-R02	2025-10-10	1 Plage	**3**	**0+550**	Enrochement Rang 2	Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère	CS	215	120	2
SB-01-03-009-R03	2025-10-10	1 Plage	**3**	**0+550**	Enrochement Rang 3	Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère	CS	110	160	1

Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère

Moyenne	151	132	4
Dimension à maturité	200	300	
Pourcentage de la dimension à maturité	76%	44%	

En dessous de la moyenne

Physocarpus opulifolius / Physocarpe à feuilles d'obier

2100845-014

Ville de Québec - Stabilisation Plage-Jacques-Cartier

Fiche : [Type de végétaux]-[identification de la phase]-[numéro du secteur]-[numéro séquentiel du point d'inventaire]-[numéro séquentiel de la rangée]

Type de végétaux : A pour arbre_SB pour arbuste en stabilisation_PB pour arbuste en parc_V pour vivace

								Données 2025		
Fiche	**Date**	**Phase**	**Tronçon**	**Chaînage**	**Rang**	**Nom du végétal**	**Code**	**Hauteur cm**	**Largeur cm**	**Nombre de tiges/m**
SB-01-01-004-R02	2025-10-10	1 Plage	**1**	**0+180**	Enrochement Rang 2	Physocarpus opulifolius / Physocarpe à feuilles d'obier	PO	140	50	1
SB-01-02-006-R02	2025-10-10	1 Plage	**2**	**0+300**	Interstice Rang 2	Physocarpus opulifolius / Physocarpe à feuilles d'obier	PO	60	27	1
SB-01-02-006-R03	2025-10-10	1 Plage	**2**	**0+300**	Interstice Rang 3	Physocarpus opulifolius / Physocarpe à feuilles d'obier	PO	40	30	1
SB-01-02-007-R02	2025-10-10	1 Plage	**2**	**0+400**	Interstice Rang 2	Physocarpus opulifolius / Physocarpe à feuilles d'obier	PO	145	85	1
SB-01-03-008-R03	2025-10-10	1 Plage	**3**	**0+500**	Enrochement Rang 3	Physocarpus opulifolius / Physocarpe à feuilles d'obier	PO	90	90	8
							Moyenne	**95**	**56**	**2**
							Dimension à maturité	**250**	**250**	
							Pourcentage de la dimension à maturité	**38%**	**23%**	

En dessous de la moyenne

Salix interior / Saule intérieur

2100845-014

Ville de Québec - Stabilisation Plage-Jacques-Cartier

Fiche : [Type de végétaux]-[identification de la phase]-[numéro du secteur]-[numéro séquentiel du point d'inventaire]-[numéro séquentiel de la rangée]

Type de végétaux : A pour arbre_SB pour arbuste en stabilisation_PB pour arbuste en parc_V pour vivace

								Données 2025		
Fiche	**Date**	**Phase**	**Tronçon**	**Chaînage**	**Rang**	**Nom du végétal**	**Code**	**Hauteur cm**	**Largeur cm**	**Nombre de tiges/m**
SB-01-01-001-R01	2025-10-10	1 Plage	**1**	**0+074,4 @ 0+090,4**	Enrochement Rang 1, 2 et 3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SB-01-01-002-R01	2025-10-10	1 Plage	**1**	**0+100**	Enrochement Rang 1	Salix interior / Saule intérieur	SI	290	230	4
SB-01-01-004-R01	2025-10-10	1 Plage	**1**	**0+180**	Enrochement Rang 1	Salix interior / Saule intérieur	SI	250	160	1
SB-01-01-005-R01	2025-10-10	1 Plage	**1**	**0+240**	Enrochement Rang 1	Salix interior / Saule intérieur	SI	270	210	4
SB-01-02-006-R01	2025-10-10	1 Plage	**2**	**0+300**	Interstice Rang 1	Salix interior / Saule intérieur	SI	80	50	1
SB-01-02-007-R01	2025-10-10	1 Plage	**2**	**0+400**	Interstice Rang 1	Salix interior / Saule intérieur	SI	130	70	1

Moyenne	**204**	**144**	**2,2**
Dimension à maturité	**500**	**300**	
Pourcentage de la dimension à maturité	**41%**	**48%**	

En dessous de la moyenne

Spiraea alba latifolia / Spirée à larges feuilles

2100845-014

Ville de Québec - Stabilisation Plage-Jacques-Cartier

Fiche : [Type de végétaux]-[identification de la phase]-[numéro du secteur]-[numéro séquentiel du point d'inventaire]-[numéro séquentiel de la rangée]

Type de végétaux : A pour arbre_SB pour arbuste en stabilisation_PB pour arbuste en parc_V pour vivace

								Données 2025		
Fiche	**Date**	**Phase**	**Tronçon**	**Chaînage**	**Rang**	**Nom du végétal**	**Code**	**Hauteur cm**	**Largeur cm**	**Nombre de tiges/m**
SB-01-01-002-R03	2025-10-10	1 Plage	**1**	**0+100**	Enrochement Rang 3	Spiraea alba latifolia / Spirée à larges feuilles	SAL	110	90	1
SB-01-01-003-R03	2025-10-10	1 Plage	**1**	**0+140**	Enrochement Rang 3	Spiraea alba latifolia / Spirée à larges feuilles	SAL	100	85	22
SB-01-01-004-R03	2025-10-10	1 Plage	**1**	**0+180**	Enrochement Rang 3	Spiraea alba latifolia / Spirée à larges feuilles	SAL	130	45	5
SB-01-01-005-R03	2025-10-10	1 Plage	**1**	**0+240**	Enrochement Rang 3	Spiraea alba latifolia / Spirée à larges feuilles	SAL	120	80	18
SB-01-02-006-R02	2025-10-10	1 Plage	**2**	**0+300**	Interstice Rang 2	Spiraea alba latifolia / Spirée à larges feuilles	SAL	70	30	1
SB-01-02-007-R03	2025-10-10	1 Plage	**2**	**0+400**	Interstice Rang 3	Spiraea alba latifolia / Spirée à larges feuilles	SAL	68	60	1
SB-01-03-008-R02	2025-10-10	1 Plage	**3**	**0+500**	Enrochement Rang 2	Spiraea alba latifolia / Spirée à larges feuilles	SAL	50	28	1
SB-01-03-008-R03	2025-10-10	1 Plage	**3**	**0+500**	Enrochement Rang 3	Spiraea alba latifolia / Spirée à larges feuilles	SAL	110	80	18
SB-01-03-009-R03	2025-10-10	1 Plage	**3**	**0+550**	Enrochement Rang 3	Spiraea alba latifolia / Spirée à larges feuilles	SAL	30	30	1
							Moyenne	**88**	**59**	**8**
							Dimension à maturité	**150**	**150**	
							Pourcentage de la dimension à maturité	**58%**	**39%**	

En dessous de la moyenne

Diervilla lonicera / Dièreville chèvrefeuille

2100845-014

Ville de Québec - Stabilisation Plage-Jacques-Cartier

Fiche : [Type de végétaux]-[identification de la phase]-[numéro du secteur]-[numéro séquentiel du point d'inventaire]-[numéro séquentiel de la rangée]

Type de végétaux : A pour arbre_SB pour arbuste en stabilisation_PB pour arbuste en parc_V pour vivace

								Données 2025		
Fiche	**Date**	**Phase**	**Tronçon**	**Chaînage**	**Rang**	**Nom du végétal**	**Code**	**Hauteur cm**	**Largeur cm**	**Nombre de tiges/m**
SB-01-01-002-R03	2025-10-10	1 Plage	**1**	**0+100**	Enrochement Rang 3	Diervilla lonicera / Dièreville chèvrefeuille	DL	130	140	1
SB-01-01-003-R03	2025-10-10	1 Plage	**1**	**0+140**	Enrochement Rang 3	Diervilla lonicera / Dièreville chèvrefeuille	DL	92	125	20
SB-01-01-004-R03	2025-10-10	1 Plage	**1**	**0+180**	Enrochement Rang 3	Diervilla lonicera / Dièreville chèvrefeuille	DL	85	90	22
SB-01-01-005-R02	2025-10-10	1 Plage	**1**	**0+240**	Enrochement Rang 2	Diervilla lonicera / Dièreville chèvrefeuille	DL	105	80	1
SB-01-01-005-R03	2025-10-10	1 Plage	**1**	**0+240**	Enrochement Rang 3	Diervilla lonicera / Dièreville chèvrefeuille	DL	125	80	5
						Moyenne		**107**	**103**	**10**
						Dimension à maturité		**130**	**100**	
						Pourcentage de la dimension à maturité		**83%**	**103%**	

En dessous de la moyenne

Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère

2100845-014

Ville de Québec - Stabilisation Plage-Jacques-Cartier

Fiche : [Type de végétaux]-[identification de la phase]-[numéro du secteur]-[numéro séquentiel du point d'inventaire]-[numéro séquentiel de la rangée]

Type de végétaux : A pour arbre_SB pour arbuste en stabilisation_PB pour arbuste en parc_V pour vivace

								Données 2025		
Fiche	Date	Phase	Tronçon	Chaînage	Rang	Nom du végétal	Code	Hauteur cm	Largeur cm	Nombre de tiges/m
SB-02-04-010-R01	2025-10-02	2 Plage	**4**	**0+645**	Caisson Rang 1	Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère	Cos	90	58	
SB-02-04-011-R02	2025-10-02	2 Plage	**4**	**0+675**	Caisson Rang 2	Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère	Cos	77	90	
SB-02-04-014-R01	2025-10-02	2 Plage	**4**	**0+705**	Caisson Rang 1	Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère	Cos	107	67	
SB-02-04-014-R02	2025-10-02	2 Plage	**4**	**0+705**	Caisson Rang 2	Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère	Cos	95	90	
SB-02-06-015-R01	2025-10-02	2 Plage	**6**	**1+227,5**	Enrochement Rang 1	Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère	Cos	75	60	
SB-02-06-016-R02	2025-10-02	2 Plage	**6**	**1+287,5**	Matelas de plançons Rang 2	Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère	Cos	88	80	
SB-02-06-016-R03	2025-10-02	2 Plage	**6**	**1+287,5**	Matelas de plançons Rang 3	Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère	Cos	55	83	
SB-02-07-017-R01	2025-10-02	2 Plage	**7**	**1+690**	Caisson Rang 1	Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère	Cos	120	100	
SB-02-07-017-R03	2025-10-02	2 Plage	**7**	**1+690**	Caisson Rang 3	Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère	Cos	100	90	
SB-02-07-019-R01	2025-10-03	2 Plage	**7**	**1+840**	Caisson Rang 1	Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère	Cos	100	80	49

Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère

SB-02-07-019-R02	2025-10-03	2 Plage	**7**	**1+840**	Caisson Rang 2	Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère	Cos	120	100	68
SB-02-07-020-R01	2025-10-03	2 Plage	**7**	**1+900**	Caisson Rang 1	Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère	Cos	100	80	38
SB-02-07-020-R02	2025-10-03	2 Plage	**7**	**1+900**	Caisson Rang 2	Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère	Cos	110	120	65
SB-02-07-021-R03	2025-10-03	2 Plage	**7**	**1+940**	Caisson Rang 3	Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère	Cos	70	90	47
SB-02-07-022-R02	2025-10-03	2 Plage	**7**	**1+990**	Enrochement Rang 2	Cornus stolonifera / Cornouiller stolonifère	Cos	82	70	8

Moyenne	93	84	46
Dimension à maturité	200	300	
Pourcentage de la dimension à maturité	46%	28%	

En dessous de la moyenn

Spiraea alba latifolia / Spirée à larges feuilles

2100845-014

Ville de Québec - Stabilisation Plage-Jacques-Cartier

Fiche : [Type de végétaux]-[identification de la phase]-[numéro du secteur]-[numéro séquentiel du point d'inventaire]-[numéro séquentiel de la rangée]

Type de végétaux : A pour arbre_SB pour arbuste en stabilisation_PB pour arbuste en parc_V pour vivace

								Données 2025		
Fiche	**Date**	**Phase**	**Tronçon**	**Chaînage**	**Rang**	**Nom du végétal**	**Code**	**Hauteur cm**	**Largeur cm**	**Nombre de tiges/m**
SB-02-04-010-R03	2025-10-02	2 Plage	**4**	**0+645**	Caisson Rang 3	Spiraea alba latifolia / Spirée à larges feuilles	Spa	63	46	
SB-02-04-011-R03	2025-10-02	2 Plage	**4**	**0+675**	Caisson Rang 3	Spiraea alba latifolia / Spirée à larges feuilles	Spa	60	20	
SB-02-07-018-R01	2025-10-02	2 Plage	**7**	**1+780**	Caisson Rang 1	Spiraea alba latifolia / Spirée à larges feuilles	Spa	72	47	
SB-02-07-018-R03	2025-10-02	2 Plage	**7**	**1+780**	Caisson Rang 3	Spiraea alba latifolia / Spirée à larges feuilles	Spa	83	44	
SB-02-07-019-R03	2025-10-03	2 Plage	**7**	**1+840**	Caisson Rang 3	Spiraea alba latifolia / Spirée à larges feuilles	Spa	85	55	67
SB-02-07-020-R03	2025-10-03	2 Plage	**7**	**1+900**	Caisson Rang 3	Spiraea alba latifolia / Spirée à larges feuilles	Spa	88	85	52
SB-02-07-022-R03	2025-10-03	2 Plage	**7**	**1+990**	Enrochement Rang 3	Spiraea alba latifolia / Spirée à larges feuilles	Spa	70	40	14
SB-02-07-022-R04	2025-10-03	2 Plage	**7**	**1+990**	Enrochement Rang 4	Spiraea alba latifolia / Spirée à larges feuilles	Spa	75	30	voir notes

Spiraea alba latifolia / Spirée à larges feuilles

Moyenne	75	46	44
Dimension à maturité	150	150	
Pourcentage de la dimension à maturité	50%	31%	

En dessous de la moyenne

Salix interior / Saule intérieur

2100845-014

Ville de Québec - Stabilisation Plage-Jacques-Cartier

Fiche : [Type de végétaux]-[identification de la phase]-[numéro du secteur]-[numéro séquentiel du point d'inventaire]-[numéro séquentiel de la rangée]

Type de végétaux : A pour arbre_SB pour arbuste en stabilisation_PB pour arbuste en parc_V pour vivace

								Données 2025		
Fiche	**Date**	**Phase**	**Tronçon**	**Chaînage**	**Rang**	**Nom du végétal**	**Code**	**Hauteur cm**	**Largeur cm**	**Nombre de tiges/m**
SB-02-04-011-R01	2025-10-02	2 Plage	**4**	**0+675**	Caisson Rang 1	Salix interior / Saule intérieur	Sai	180	70	
SB-02-06-015-R01	2025-10-02	2 Plage	**6**	**1+227,5**	Matelas de plançons Rang 1	Salix interior / Saule intérieur	Sai	150	30	
SB-02-06-016-R01	2025-10-02	2 Plage	**6**	**1+287,5**	Enrochement Rang 1	Salix interior / Saule intérieur	Sai	175	60	
SB-02-06-016-R01	2025-10-02	2 Plage	**6**	**1+287,5**	Matelas de plançons Rang 1	Salix interior / Saule intérieur	Sai	144	25	
SB-02-07-021-R01	2025-10-03	2 Plage	**7**	**1+940**	Caisson Rang 1	Salix interior / Saule intérieur	Sai	200	85	34
SB-02-07-021-R02	2025-10-03	2 Plage	**7**	**1+940**	Caisson Rang 2	Salix interior / Saule intérieur	Sai	170	85	16
SB-02-07-022-R01	2025-10-03	2 Plage	**7**	**1+990**	Enrochement Rang 1	Salix interior / Saule intérieur	Sai	210	120	19,5
							Moyenne	176	59	23
							Dimension à maturité	500	300	
							Pourcentage de la dimension à maturité	35%	20%	

En dessous de la moyenne

Salix eriocephala / Saule à tête laineuse

2100845-014

Ville de Québec - Stabilisation Plage-Jacques-Cartier

Fiche : [Type de végétaux]-[identification de la phase]-[numéro du secteur]-[numéro séquentiel du point d'inventaire]-[numéro séquentiel de la rangée]

Type de végétaux : A pour arbre_SB pour arbuste en stabilisation_PB pour arbuste en parc_V pour vivace

								Données 2025		
Fiche	**Date**	**Phase**	**Tronçon**	**Chaînage**	**Rang**	**Nom du végétal**	**Code**	**Hauteur cm**	**Largeur cm**	**Nombre de tiges/m**
SB-02-06-015-R02	2025-10-02	2 Plage	**6**	**1+227,5**	Matelas de plançons Rang 2	Salix eriocephala / Saule à tête laineuse	Sae	170	30	
SB-02-06-016-R01	2025-10-02	2 Plage	**6**	**1+287,5**	Enrochement Rang 1	Salix eriocephala / Saule à tête laineuse	Sae	110	15	
SB-02-06-016-R01	2025-10-02	2 Plage	**6**	**1+287,5**	Matelas de plançons Rang 1	Salix eriocephala / Saule à tête laineuse	Sae	173	45	
SB-02-07-017-R02	2025-10-02	2 Plage	**7**	**1+690**	Caisson Rang 2	Salix eriocephala / Saule à tête laineuse	Sae	170	130	
SB-02-07-018-R02	2025-10-02	2 Plage	**7**	**1+780**	Caisson Rang 2	Salix eriocephala / Saule à tête laineuse	Sae	120	130	
SB-02-07-022-R01	2025-10-03	2 Plage	**7**	**1+990**	Enrochement Rang 1	Salix eriocephala / Saule à tête laineuse	Sae	135	75	10

Moyenne	146	71
Dimension à maturité	500	300
Pourcentage de la dimension à maturité	29%	24%

En dessous de la moyenne

Physocarpus opulifolius / Physocarpe à feuilles d'obier

2100845-014

Ville de Québec - Stabilisation Plage-Jacques-Cartier

Fiche : [Type de végétaux]-[identification de la phase]-[numéro du secteur]-[numéro séquentiel du point d'inventaire]-[numéro séquentiel de la rangée]

Type de végétaux : A pour arbre_SB pour arbuste en stabilisation_PB pour arbuste en parc_V pour vivace

								Données 2025		
Fiche	**Date**	**Phase**	**Tronçon**	**Chaînage**	**Rang**	**Nom du végétal**	**Code**	**Hauteur cm**	**Largeur cm**	**Nombre de tiges/m**
SB-02-07-022-R02	2025-10-03	2 Plage	**7**	**1+990**	Enrochement Rang 2	Physocarpus opulifolius / Physocarpe à feuilles d'obier	Pho	120	60	7
SB-02-07-022-R04	2025-10-03	2 Plage	**7**	**1+990**	Enrochement Rang 4	Physocarpus opulifolius / Physocarpe à feuilles d'obier	Rob	60	70	voir notes
							Moyenne	90	65	
							Dimension à maturité	250	250	
							Pourcentage de la dimension à maturité	36%	26%	

En dessous de la moyenne
